



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA JUV-CP003/2024/2024

OBJETO: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO: Rua. Coronel Rangel - 330, SALA - 203 D, Bairro: Centro CEP.: 62.010-030.

E-MAIL: construvasp@hotmail.com **TEL:** (88) 99701-2524

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 742.192,58 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil Cento e Noventa e Dois reais e Cinquenta e Oito centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas.
Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Sobral-CE, 12 DE DEZEMBRO DE 2024.
Atenciosamente

VANESSA ARAÚJO DE SOUZA-04937349376
Atuando em nome legal por
VANESSA ARAÚJO DE SOUZA-04837748978
Dados: 2024.12.11 14:56:01 -40368

CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – CNPJ 50.4846244/0001-65
VANESSA ARAÚJO DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 049.373.493-76

TOMAZ DE AQUINO GOMES
Assinado em nome legal por TOMAZ DE
PARENTE FILHO-6240604391
Dados: 2024.12.11 14:56:01 -40368

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO – CPF: 624.060.943-91
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 624.060.943-91
RNP: 0603344348

Coronel Rangel - 330, Sala - 203 D
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
construvasp@hotmail.com
(88) 99701-2524

50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	REQUISIÇÃO	
							COM BDI	COM IPI
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	ADMUNL01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00	R\$ 23.571,93	R\$ 23.571,93	R\$ 23.571,93	R\$ 23.571,93
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	136849	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA	M2	12,00	R\$ 331,71	R\$ 61,34	R\$ 61,34	R\$ 410,06
2.2	9825	LIMPEZA, MANTENÇÃO DE JARDIM, VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	5.203,25	R\$ 0,80	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 410,06
2.3	C361	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.042,42	R\$ 252,80	R\$ 1.295,22	R\$ 1.295,22
2.4	C360	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.101,40	R\$ 294,79	R\$ 1.446,16	R\$ 1.446,16
2.5	9789	DEVOLUÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA	M3	2,44	R\$ 85,80	R\$ 13,83	R\$ 69,23	R\$ 164,92
2.6	C166	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LAJOTA DE CONCRETO	M2	282,14	R\$ 27,14	R\$ 6,65	R\$ 33,79	R\$ 4518,91
2.7	C346	RETRABALHO DE URBAN DE FERRO	M2	29,07	R\$ 8,92	R\$ 2,08	R\$ 10,81	R\$ 207,29
2.8	C161	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	34,00	R\$ 20,80	R\$ 5,65	R\$ 25,65	R\$ 672,10
2.9	9783	DEVOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	101,12	R\$ 21,50	R\$ 5,37	R\$ 26,77	R\$ 2.205,96
2.10	C210	RETRABALHO DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	35,28	R\$ 16,70	R\$ 4,80	R\$ 20,78	R\$ 735,47
2.11	C296	RETRABALHO DE ESCURIMOS METÁLICOS	M2	22,84	R\$ 10,44	R\$ 2,36	R\$ 13,00	R\$ 208,22
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C372	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,58	R\$ 28,37	R\$ 8,68	R\$ 35,25	R\$ 1.080,38
3.2	C293	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	30,58	R\$ 28,32	R\$ 8,54	R\$ 35,26	R\$ 1.078,25
3.3	C276	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE LAJOTA, PROF. ATÉ 1,00m	M3	9,72	R\$ 48,82	R\$ 12,00	R\$ 60,32	R\$ 892,14
TOTAL						R\$ 29.351,02	R\$ 29.351,02	R\$ 29.351,02

CONSTRUVASP CONSTR. & SERVIÇOS LTDA - Rua. Coronel Rangel, 330 - Sala - 203 D - Sobral - CE - 62010-030
CNPJ: 50.484.624/0001-65
construvasp@construvasp.com.br | (88) 99701-2524



CONSTRUAS		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		CONTRUASIP CONSTR. E SERVIÇOS LTDA (R. Coque Range, 330 - Sala - 020 01)		Página: 2	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POSTO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
4	C201	REATERIO COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEM/PA	M2	0,72	R\$ 31,38	R\$ 22,58
4.1	COMP. 40.00	EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM (MATERIAL COMPOSTO POR ALUMÍNIO)	CONSTRUCOES	M2	31,48	R\$ 230,57	R\$ 7.252,84
5	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL						
5.1	C066	LIMPIZA DE SUPERFÍCIE O ESCRVA DE AÇO	SEM/PA	M2	186,83	R\$ 7,28	R\$ 1.358,11
5.2	C060	PINTURA PROTEÇÃO ANÓDICA MIGRATÓRIA CORRÓSÃO, 3 DEMÃO	SEM/PA	M2	186,83	R\$ 21,23	R\$ 3.966,51
5.3	C478	RECUPERAÇÃO CONCRETO, CREPISCO E RECONSTITUIÇÃO "GROUND". ESP. 40MM	SEM/PA	M2	186,83	R\$ 40,38	R\$ 7.544,84
5.4	C476	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEM/PA	M1	3.400,00	R\$ 6,85	R\$ 23.290,00
6	SEGURANÇAS E FERREJENS						
6.1	C323	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, "RECORTE" TOTAL O LAMBR	SEM/PA	M0	24,90	R\$ 336,20	R\$ 8.371,38
6.2	9-108	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM LAMBRAS COM DILATAÇÃO, PIVOTAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122019	SEM/PA	M2	30,38	R\$ 476,54	R\$ 14.480,44
6.3	C428	GRANDE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEM/PA	M2	28,02	R\$ 205,36	R\$ 5.754,19
7	COBERTURA						
7.1	C201	RETELHAMENTO O TESSA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEM/PA	M2	168,13	R\$ 54,24	R\$ 9.119,43
8	REVESTIMENTOS						
8.1	8764	EMBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2 E PREPARO MANUAL, APLICAÇÃO MANUALENTE EM PAREDES E TETOIS	SEM/PA	M2	347,79	R\$ 21,82	R\$ 7.588,17
8.2	C087	REPOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PRÉ-MIADA, TRACO 1:4	SEM/PA	M2	120,42	R\$ 46,79	R\$ 5.638,36
8.3	8773	ISOLADA DE DIMENSÕES EXIGIDAS EM APLICAÇÃO NA ALTIMA INTERIOR DAS PAREDES, AF. 020203 PE	SEM/PA	M2	317,79	R\$ 53,02	R\$ 16.850,19

CONSTRUAS		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		CONTRUASIP CONSTR. E SERVIÇOS LTDA (R. Coque Range, 330 - Sala - 020 01)		Página: 3	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POSTO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
9	PISOS						
9.1	C260	LACTIO DE AREIA ADQUIRIDA	SEM/PA	M3	82,38	R\$ 170,28	R\$ 13.998,32
9.2	C469	PRDO INTERTRAVADO TIPO TUCULINHO (80 X 10 X 10) CHIA - COMPACTAÇÃO	SEM/PA	M2	102,06	R\$ 38,06	R\$ 3.884,31
9.3	8241	MASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAMES SOLDO OU RAZES, ESPESURA DE 2 CM, AF. 010204	SEM/PA	M2	460,89	R\$ 7,54	R\$ 3.473,27
9.4	C-166	PRDO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12cm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEM/PA	M2	460,89	R\$ 121,47	R\$ 56.086,13
9.5	C085	BAQUETA MIO FIO DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL	SEM/PA	M	180,04	R\$ 25,12	R\$ 4.523,05
9.6	C401	RODAPE DE GRANITO 40x10 cm	SEM/PA	M	213,68	R\$ 34,84	R\$ 7.444,72
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
10.1	8888	TAPO ANTIÁRIO SIFONADO COM CHAM. ACOPLAGA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 010208	SEM/PA	UN	22,00	R\$ 391,41	R\$ 8.611,02
10.2	C465	BACA SANITÁRIA PARA CADERANTES O/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEM/PA	UN	4,00	R\$ 875,20	R\$ 3.500,80
10.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEM/PA	UN	14,00	R\$ 10,95	R\$ 153,30
10.4	C467	PORTA PAPEL METÁLICO	SEM/PA	UN	28,00	R\$ 27,40	R\$ 765,20
10.5	C471	SABONETEIRA METÁLICA	SEM/PA	UN	14,00	R\$ 34,22	R\$ 479,08
10.6	8643	TAPO DO CUBA DE DESCARGA 30X30X30 CM, COM TUBO DE DRENAGEM PLÁSTICO 30X30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 010208	SEM/PA	UN	12,00	R\$ 108,89	R\$ 1.306,68
11	MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO						
11.1	C202	DESGRUBAGEM EM LIGAÇÃO DE ESGOTO EM 180 CALIPEZA DA CAIXA	SEM/PA	UN	42,00	R\$ 40,72	R\$ 1.710,24
11.2	C204	RECUPERAÇÃO DE CHAMA DE INSPEÇÃO	SEM/PA	UN	10,00	R\$ 65,44	R\$ 654,40
12	DRENAGEM PLUVIAL						
							R\$ 7.588,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DO ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONCRETO DE REPARO Nº 003/2024
 ENDEREÇO: RUA DA TRAVESSIA Nº 1008-10-22
 LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

DATA: 08/12/2024
 VALOR UNITÁRIO R\$
 QTD
 VALOR TOTAL R\$

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
13.3.5	0002981	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RESCIVEL DE 2", SEM LUBA	M	152,18	R\$ 12,54	R\$ 1.908,72
13.3.6	0002980	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RESCIVEL DE 4", SEM LUBA	M	42,14	R\$ 36,15	R\$ 1.521,69
13.3.7	0002980	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RESCIVEL DE 1", SEM LUBA	M	70,86	R\$ 5,24	R\$ 371,46
13.3.8	0001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMINIO RIGIDO COMBINADO De 100x100mm	UN	12,00	R\$ 167,85	R\$ 2.014,20
13.3.9	00019	HASTE DE TUBERIA Ø10x1,00m GOW 19.30	UN	7,00	R\$ 130,00	R\$ 910,00
13.3.10	0001	CABO COBRE NU Ø10MM	M	433,07	R\$ 40,59	R\$ 17.574,12
13.3.11	0008	PARA-RAIO 1P50 FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	R\$ 2.611,75	R\$ 10.447,00
13.3.12	0109	DISJUNTOR TRIFÁSICO COMANDO NA PORTA DO QD.ATE 200A	UN	1,00	R\$ 1.899,20	R\$ 1.899,20
13.3.13	0011	DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M AF 132200	UN	18,00	R\$ 37,20	R\$ 669,60
13.3.14	0104	DISJUNTOR TRIFÁSICO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	R\$ 80,59	R\$ 322,36
13.3.15	0104	DISJUNTOR TRIFÁSICO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	R\$ 80,59	R\$ 80,59
13.3.16	0102	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	R\$ 20,86	R\$ 83,44
13.3.17	0109	DISJUNTOR TRIFÁSICO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 80,59	R\$ 80,59
13.3.18	0001	PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W C/FOTOCELULA	UN	36,00	R\$ 651,72	R\$ 23.461,92
13.3.19	0001	CABO ISOLADO PVC 15X19MM2	M	1.807,64	R\$ 14,08	R\$ 25.440,35
13.3.20	0002	CABO COBRE NU 35MM2	M	10,00	R\$ 31,75	R\$ 317,50
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUBTERRÂNEAS POR LENOÇÓL (TRATADO)	M2	44,58	R\$ 42,87	R\$ 1.910,85

WANGSA ANILAS & SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Augusto, 133 - 506 - 020 D) - NOVA RUSSAS - CE
 CNPJ: 06.483.746/0001-00
 CONSTRUVAP CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Augusto, 133 - 506 - 020 D) - NOVA RUSSAS - CE
 CNPJ: 06.483.746/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DO ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONCRETO DE REPARO Nº 003/2024
 ENDEREÇO: RUA DA TRAVESSIA Nº 1008-10-22
 LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

DATA: 08/12/2024
 VALOR UNITÁRIO R\$
 QTD
 VALOR TOTAL R\$

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
14.2	0407	PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107 DUAS DEMÃO	M2	749,54	R\$ 11,34	R\$ 8.503,83
15	PINTURA					R\$ 78.885,88
15.1	0589	CAIXA EM TRES DIMENSÃO EM PAREDES	M2	1.871,50	R\$ 7,71	R\$ 14.437,22
15.2	0607	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO	M2	848,37	R\$ 14,29	R\$ 12.118,77
15.3	0649	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF 102020	M2	566,40	R\$ 2,59	R\$ 1.466,87
15.4	0104	LÁTEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SUASSA	M2	281,21	R\$ 22,84	R\$ 6.420,56
15.5	0407	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUVIDADOR PARABOLIZ DE 3M x 1"	UN	281,21	R\$ 50,89	R\$ 14.309,69
15.6	10099	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE AZULAMENTO (EMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PAVIMENTAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃO) AF 302020 PE	M2	35,28	R\$ 40,86	R\$ 1.441,48
15.7	0101	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	31,48	R\$ 10,36	R\$ 326,28
16	SERVIÇOS GERAIS					R\$ 2.222,80
16.1	0108	LIMPEZA GERAL	M2	448,50	R\$ 12,92	R\$ 5.790,80

WANGSA ANILAS & SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Augusto, 133 - 506 - 020 D) - NOVA RUSSAS - CE
 CNPJ: 06.483.746/0001-00
 CONSTRUVAP CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Augusto, 133 - 506 - 020 D) - NOVA RUSSAS - CE
 CNPJ: 06.483.746/0001-00



RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA:	06/12/2024	BDI:	24,52%
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REFERÊNCIA Nº 00040819	VERBA:	NOVA	NOVA	NOVA
CERTAME:	JUN-CP003/2024	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
DATA DO CERTAME:	12/11/2024	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
LOCAL:	NOVA RUISSAS - CE	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 28.351,02	3,95%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.200,03	3,40%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.130,54	0,42%
4	PAREDES E PAINES	R\$ 7.972,28	1,07%
5	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 145.354,36	19,59%
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 38.562,78	5,20%
7	COBERTURA	R\$ 11.220,42	1,51%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 39.078,43	5,27%
9	PISOS	R\$ 180.937,32	20,34%
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 16.840,16	2,54%
11	MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO	R\$ 3.236,90	0,44%
12	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 7.568,52	1,02%
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 162.779,16	21,93%
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.852,18	1,73%
15	PINTURA	R\$ 76.886,58	10,63%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 7.222,80	0,97%
VALOR TOTAL:		R\$ 742.192,58	100,00%

Setecentos e Quarenta e Dois Mil Cento e Noventa e Dois reais e Cinquenta e Oito centavos

VANESSA ARAUJO, Autenticado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA 049373495. Data: 2024.12.10 14:56:47 -03:00

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO 62405094391. Data: 2024.12.10 14:56:54 -03:00

CONSTRUVASP CONST & SERVICOS LTDA | R. Coronel Ranget, 330 - Sala - (203 D) Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Soanance construvasp@hotmail.com | (86) 99701-2524

Página 6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:	09/12/2024	BDI:	24,52%
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REFERÊNCIA Nº 00040819	VERBA:	NOVA	NOVA	NOVA
CERTAME:	JUN-CP003/2024	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
DATA DO CERTAME:	12/11/2024	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
LOCAL:	NOVA RUISSAS - CE	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA

Mês de Base	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	1,010000000	R\$ 17.721,87	R\$ 17.899,09
00040819 - MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,000000000	R\$ 5.672,24	R\$ 5.672,24
TOTAL Mês de Obr.				R\$ 23.571,33
VALOR:				R\$ 23.571,33

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESVADA, DE 7,5 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,000000000	R\$ 277,12	R\$ 277,12
00005065 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,011300000	R\$ 17,94	R\$ 0,20
00005068 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,015200000	R\$ 9,61	R\$ 0,13
00004508 - SARRAFO 7,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,208300000	R\$ 3,89	R\$ 12,48
TOTAL Material				R\$ 298,93

Mão de Obra para Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8252 - CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,372900000	R\$ 25,63	R\$ 9,56
8518 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,118600000	R\$ 20,11	R\$ 22,80
TOTAL Mão de Obra para Encargos Complementares				R\$ 32,36

Servicos	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	M2	0,500000000	R\$ 19,43	R\$ 9,72
TOTAL Serviço				R\$ 9,72
VALOR:				R\$ 331,71

Equipamento para Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP - PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO AF_06/2014	CHI	0,002000000	R\$ 73,93	R\$ 0,21
89032 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP - PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO AF_06/2014	CHP	0,001700000	R\$ 175,00	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento para Obra				R\$ 0,51

Mês de Base para Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000000000	R\$ 20,39	R\$ 0,09
TOTAL Encargos Complementares				R\$ 0,09
VALOR:				R\$ 0,60

2.1. 103888 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS (M2)

2.2. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_03/2024 (M2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

Rúbrica

CONSTRUVASP CONST & SERVICOS LTDA | R. Coronel Ranget, 330 - Sala - (203 D) Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Soanance construvasp@hotmail.com | (86) 99701-2524

Página 8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE, CAPACIDADE DA CACAMBA 17 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_09/2023	DATA: 09/12/2024	BIDI: 24,52%
	CERTAME: 202404 COM ZEROCATEGORIA	VERBAO: 81.44%	MES: 47,68%
	DATA DO CERTAME: 12/12/2024	SEINFRA: 25094 COM ZEROCATEGORIA	SEINFRA: 85,96%
	LOCAL: NOVA RUISSAS - CE	SINAPI: 35048 COM ZEROCATEGORIA	SINAPI: 87,87%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	PROPRIA: 0,00%	PROPRIA: 0,00%

2.3. C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

UN	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020	ADAPTADOR SOLDAVEL G1/2X1/2" P/CAÇA-ÁGUA 32x1"	UN	1,00000000	RS 13,64	RS 13,64
10403	CAÇECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00000000	RS 69,83	RS 69,83
10405	CAIBRO DE 2x1"	M	10,00000000	RS 44,30	RS 443,00
110268	CAUA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,50000000	RS 405,11	RS 202,56
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6x3"	M	10,00000000	RS 239,30	RS 2393,00
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4x2"	M	5,00000000	RS 10,52	RS 52,60
12410	PREGO 18X27 (2,12" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,50000000	RS 9,84	RS 4,92
12201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (17)	M	4,00000000	RS 5,30	RS 21,20
			TOTAL Material:		RS 650,87

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	UN	1,00000000	RS 13,64	RS 13,64
SEINFRA	UN	1,00000000	RS 69,83	RS 69,83
SEINFRA	M	10,00000000	RS 44,30	RS 443,00
SEINFRA	UN	0,50000000	RS 405,11	RS 202,56
SEINFRA	M	10,00000000	RS 239,30	RS 2393,00
SEINFRA	M	5,00000000	RS 10,52	RS 52,60
SEINFRA	KG	0,50000000	RS 9,84	RS 4,92
SEINFRA	M	4,00000000	RS 5,30	RS 21,20
			TOTAL Material:	RS 650,87

2.4. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

UN	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10125	ARMADAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDAVA	UN	1,00000000	RS 56,71	RS 56,71
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00000000	RS 6,48	RS 387,60
10840	CONECTOR SPURT-BOLT P/ CABO 10MM2	UN	4,00000000	RS 4,17	RS 16,68
10952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICIDADE DE 1"	UN	2,00000000	RS 2,87	RS 5,74
11070	ELÉTRICIDADE DE PVC RÍGIDO 1"	M	6,00000000	RS 4,05	RS 24,30
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 58" x 2,40M	UN	1,00000000	RS 36,91	RS 36,91
11406	LUA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICIDADE 1"	UN	2,00000000	RS 1,14	RS 2,28
12383	NOFUSE DE 70 A	UN	1,00000000	RS 20,20	RS 20,20
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (1500R), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00000000	RS 416,86	RS 416,86
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,00000000	RS 188,72	RS 188,72
			TOTAL Material:		RS 1.161,40

2.5. 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

UN	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5842	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 17 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,13040000	RS 79,12	RS 11,03
			TOTAL		RS 11,03

CONSTRUASVP CONST. & SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D) Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE construvasp@hotmail.com | (88) 99701-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE, CAPACIDADE DA CACAMBA 17 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	DATA: 09/12/2024	BIDI: 24,52%
	CERTAME: 202404 COM ZEROCATEGORIA	VERBAO: 81.44%	MES: 47,68%
	DATA DO CERTAME: 12/12/2024	SEINFRA: 25094 COM ZEROCATEGORIA	SEINFRA: 85,96%
	LOCAL: NOVA RUISSAS - CE	SINAPI: 35048 COM ZEROCATEGORIA	SINAPI: 87,87%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	PROPRIA: 0,00%	PROPRIA: 0,00%

2.6. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

UN	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,13000000	RS 24,16	RS 3,14
12543	SERVELENTE	H	1,30000000	RS 18,46	RS 24,00
			TOTAL Mão de Obra:		RS 27,14
			VALOR:		RS 27,14

2.7. C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

UN	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,20000000	RS 24,16	RS 4,83
12543	SERVELENTE	H	0,20000000	RS 18,46	RS 3,69
			TOTAL Mão de Obra:		RS 8,52
			VALOR:		RS 8,52

2.8. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

UN	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12330	ENCANADOR	H	0,23010000	RS 23,48	RS 4,70
12391	PEDREIRO	H	0,20000000	RS 24,16	RS 4,83
12543	SERVELENTE	H	0,60000000	RS 18,46	RS 11,08
			TOTAL Mão de Obra:		RS 20,61
			VALOR:		RS 20,60

2.9. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

UN	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86296	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23010000	RS 25,83	RS 5,94
86316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77400000	RS 20,11	RS 15,57
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		RS 21,51
			VALOR:		RS 21,50

2.10. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATELANTES (M2)

UN	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,08000000	RS 24,16	RS 1,93
12543	SERVELENTE	H	0,80000000	RS 18,46	RS 14,77
			TOTAL		RS 16,70

CONSTRUASVP CONST. & SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D) Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE construvasp@hotmail.com | (88) 99701-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA - CE. COMPRISE CONTRATO DE REPARO Nº 0001/2024. LOCAL: NOVA RUSSA - CE. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA - CE.

DATA: 06/12/2024

VERSÃO: 0004

BDI: 24,50%

IMPORTE: R\$ 16,70

VALOR: R\$ 16,70

UNID: M²

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 16,70

TOTAL: R\$ 16,70

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M²	1	R\$ 16,70	R\$ 16,70

2.1. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1	R\$ 16,70	R\$ 16,70

3.1. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	1	R\$ 15,08	R\$ 15,08

3.2. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	1	R\$ 28,32	R\$ 28,32

3.3. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	1	R\$ 48,92	R\$ 48,92

3.4. C2821 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	1	R\$ 31,38	R\$ 31,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA - CE. COMPRISE CONTRATO DE REPARO Nº 0001/2024. LOCAL: NOVA RUSSA - CE. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA - CE.

DATA: 06/12/2024

VERSÃO: 0004

BDI: 24,50%

IMPORTE: R\$ 203,31

VALOR: R\$ 203,31

UNID: M2

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 203,31

TOTAL: R\$ 203,31

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1	R\$ 203,31	R\$ 203,31

4.1. COMP_NR_02 EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM (MATERIAL COMPOSTO POR ALUMINIO) (M2)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1	R\$ 203,31	R\$ 203,31

4.1. C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO (M2)


UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1	R\$ 7,38	R\$ 7,38

5.2. C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSO, 3 DEMÃOS (M2)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1	R\$ 8,18	R\$ 8,18

5.3. C4738 RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSOLIDAÇÃO "PROUNT", ESP. 200MM (M2)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1	R\$ 194,21	R\$ 194,21

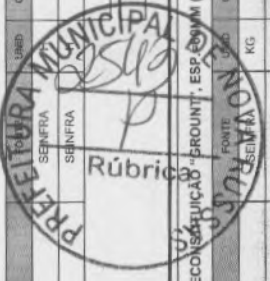

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONDOMÍNIO CONTRATO DE TRABALHO Nº. 1000510-22.	DATA:	19/12/2024	BOM:	24,52%	REF:
	CERTAME:	JUN-CR003/2024	UNID:	UN	10000		
	DATA DO CERTAME:	12/12/2024	UNID:	UN	10000		
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	UNID:	UN	10000		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	UNID:	UN	10000		

UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	ALIJANTE DE ARMADOR/FERRERO	H	4,00000000	R\$ 19,10
10121	ARMADOR/FERRERO	H	4,00000000	R\$ 24,16
11142	ESTUADOR	H	4,00000000	R\$ 24,16
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 67,42
	VALOR:			R\$ 463,89

6.1. C4125 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)

UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIVE - LOCAÇÃO	M3/MÊ	1,00000000	R\$ 2,02
	TOTAL Mensal			R\$ 2,02
	VALOR:			R\$ 6,85

6.2. C3735 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIJO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18605	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIJO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	1,00000000	R\$ 336,06
	TOTAL Mensal			R\$ 336,06
	VALOR:			R\$ 336,06

6.3. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007598	PLACA DE NYLON SEM ASA S10 COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBRESBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,31666667	R\$ 0,84
00006888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARBIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 2x5 ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,85400000	R\$ 20,19
00004814	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/MONTADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNIÇÃO/LACRAGEM	M2	1,00000000	R\$ 206,06
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,86290000	R\$ 23,64
	TOTAL Mensal			R\$ 464,11
	VALOR:			R\$ 476,84

UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35630000	R\$ 9,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17760000	R\$ 3,58
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 12,83
	VALOR:			R\$ 476,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONDOMÍNIO CONTRATO DE TRABALHO Nº. 1000510-22.	DATA:	19/12/2024	BOM:	24,52%	REF:
	CERTAME:	JUN-CR003/2024	UNID:	UN	10000		
	DATA DO CERTAME:	12/12/2024	UNID:	UN	10000		
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	UNID:	UN	10000		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	UNID:	UN	10000		

6.3. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M2	0,06880000	R\$ 57,90
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,57000000	R\$ 0,38
19045	CIMENTO PORTLAND	KG	2,84000000	R\$ 0,49
11222	GRADE DE FERRO	M2	1,00000000	R\$ 75,29
	TOTAL Mensal			R\$ 77,52
	VALOR:			R\$ 295,38

UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12361	PEDREIRO	H	3,00000000	R\$ 24,16
12543	SERVENTE	H	3,00000000	R\$ 16,46
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 40,62
	VALOR:			R\$ 295,38

7.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,00000000	R\$ 0,49
	TOTAL Mensal			R\$ 7,35
	VALOR:			R\$ 7,35

UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,10000000	R\$ 24,16
12543	SERVENTE	H	1,10000000	R\$ 16,46
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 40,62
	VALOR:			R\$ 54,24

8.1. 87554 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024 (M2)


UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28050000	R\$ 7,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14020000	R\$ 3,63
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 10,89
	VALOR:			R\$ 54,24

UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87359	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CUMPRINDO A REGRAS DE ABRENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEGETAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2018)	M2	0,01940000	R\$ 562,90
	TOTAL Mensal			R\$ 10,92
	VALOR:			R\$ 21,82

UNID	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,16
	TOTAL Mensal			R\$ 14,50
	VALOR:			R\$ 21,82



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OBRA: REFORMA DO ESTÁGIO MUNICIPAL DE FUTURO, DE NOVA RUSSA - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 009/2023/SEMESP/CE E PLANO DE TRABALHO Nº 190310-22.		DATA: 09/12/2024		BDI: 24,52%	
CERTAME: 00000000		FONTE: SEINFRA		VENDA: 0,00%		IVA: 0,00%	
DATA DO CERTAME: 09/12/2024		FONTE: SEINFRA		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%	
LOCAL: NOVA RUSSA - CE		FONTE: SEINFRA		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA - CE		FONTE: SEINFRA		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%	

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12540	SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 11,08
TOTAL Mês de Ocri:				R\$ 25,58
00165	ARGAMASSA DE CIMENTO E ARENFIN, TRACO 1:4	M3	0,07500000	R\$ 21,21
TOTAL Mês de Ocri:				R\$ 21,21
VALOR:				R\$ 46,79

8.3. 97273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001381	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS	KG	8,85000000	R\$ 5,54
0003437	REJUNTE CIMENTICIO, QUALIDIER COR	KG	0,22200000	R\$ 1,01
0000036	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENHOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x5 CMZ	M2	1,07900000	R\$ 22,36
TOTAL Mês de Ocri:				R\$ 28,71
VALOR:				R\$ 38,71

9.1. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)


Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108	AREIA GROSSA	M3	1,15000000	R\$ 95,28
TOTAL Mês de Ocri:				R\$ 95,28
VALOR:				R\$ 53,92

9.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	H	0,07570000	R\$ 2,45
0025	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,00410000	R\$ 0,19
TOTAL Mês de Ocri:				R\$ 2,64
VALOR:				R\$ 119,28

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,05680000	R\$ 3,29
0403	PÓ DE PEDRA	M3	0,00650000	R\$ 0,35
0613	TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,00000000	R\$ 24,59
TOTAL Mês de Ocri:				R\$ 28,23
VALOR:				R\$ 121,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OBRA: REFORMA DO ESTÁGIO MUNICIPAL DE FUTURO, DE NOVA RUSSA - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 009/2023/SEMESP/CE E PLANO DE TRABALHO Nº 190310-22.		DATA: 09/12/2024		BDI: 24,52%	
CERTAME: 00000000		FONTE: SEINFRA		VENDA: 0,00%		IVA: 0,00%	
DATA DO CERTAME: 09/12/2024		FONTE: SEINFRA		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%	
LOCAL: NOVA RUSSA - CE		FONTE: SEINFRA		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA - CE		FONTE: SEINFRA		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%		DESPESAS COM DESPESAS: 0,00%	

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALDETEIRO	H	0,15950000	R\$ 24,16
12543	SERVENTE	H	0,15950000	R\$ 18,46
TOTAL Mês de Ocri:				R\$ 42,62
VALOR:				R\$ 38,06

9.3. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25415000	R\$ 25,97
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09190000	R\$ 20,11
TOTAL Mês de Ocri com Encargos Complementares:				R\$ 46,08
VALOR:				R\$ 29,03

9.4. C-1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS, POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,20000000	R\$ 1,97
00748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,80000000	R\$ 1,40
TOTAL Equipamento Cuido Horário:				R\$ 3,37
VALOR:				R\$ 29,93

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,00000000	R\$ 6,50
01018	AREIA GROSSA	M3	0,03000000	R\$ 2,49
05508	CERA	KG	0,15000000	R\$ 2,08
00855	CIMENTO PORTLAND	KG	28,56000000	R\$ 13,02
00867	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,05000000	R\$ 0,49
11101	ESMERIL N.38	UN	0,10000000	R\$ 3,13
11102	ESMERIL N.60	UN	0,05000000	R\$ 1,59
11316	JUNTA PLÁSTICA 17/27MM PARA PISOS	M	2,50000000	R\$ 2,85
TOTAL Mês de Ocri:				R\$ 32,58
VALOR:				R\$ 121,47

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H	1,50000000	R\$ 36,24
12381	PIEDREIRO	H	1,20000000	R\$ 28,99
12543	SERVENTE	H	1,20000000	R\$ 22,15
TOTAL Mês de Ocri:				R\$ 87,38
VALOR:				R\$ 121,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - DE CONDIÇÃO CONTRATUAL DE REGIME FIDUCIÁRIO PARA APLICAÇÃO E PLANO DE TRABALHO N.º 10335/10-22	DATA: 06/12/2024	BDI: 24,52%
	CERTAME: JUN-CP003/2024	VERBA: 086.1 COM DESIGNAÇÃO 3030VA COM DESIGNAÇÃO 3030VA COM DESIGNAÇÃO	MAR: 07/68%
	DATA DO CERTAME: 12/12/2024	SEINFRA: 203488 COM DESIGNAÇÃO 203488 COM DESIGNAÇÃO	MEB: 07/2024
	LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	PROFISPA: 3030VA COM DESIGNAÇÃO 3030VA COM DESIGNAÇÃO	08/2024
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE			

9.5. C0365 BANQUETA/ MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
E544	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,04	R\$ 3,04
TOTAL MIO de Obra:					R\$ 3,04

MIO de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,16	R\$ 3,62
12543	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,46	R\$ 4,62
TOTAL MIO de Obra:					R\$ 8,24
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0588	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,14	R\$ 1,29
C3288	SEINFRA	M3	0,05400000	R\$ 342,96	R\$ 17,66
C3211	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,24	R\$ 0,16
C2784	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,92	R\$ 0,73
TOTAL Serviço:					R\$ 13,84
VALOR:					R\$ 25,12

9.6. C4001 RODAPE DE GRANITO H=10 cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 57,30	R\$ 0,17
10441	SEINFRA	KG	0,46000000	R\$ 0,87	R\$ 0,91
10005	SEINFRA	KG	0,91000000	R\$ 0,49	R\$ 0,45
17497	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 32,15	R\$ 32,15
TOTAL Material:					R\$ 33,68
MIO de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,16	R\$ 1,21
12543	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 18,46	R\$ 0,55
TOTAL MIO de Obra:					R\$ 1,76
VALOR:					R\$ 34,84

10.1. 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006138	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,50	R\$ 7,50
00019422	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 283,60	R\$ 283,60
00004384	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 15,70	R\$ 31,40
00031229	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 65,36	R\$ 8,45
TOTAL Material:					R\$ 332,86
MIO de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
12543	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,46	R\$ 5,54
TOTAL MIO de Obra:					R\$ 17,62
VALOR:					R\$ 350,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - DE CONDIÇÃO CONTRATUAL DE REGIME FIDUCIÁRIO PARA APLICAÇÃO E PLANO DE TRABALHO N.º 10335/10-22	DATA: 06/12/2024	BDI: 24,52%
	CERTAME: JUN-CP003/2024	VERBA: 086.1 COM DESIGNAÇÃO 3030VA COM DESIGNAÇÃO 3030VA COM DESIGNAÇÃO	MAR: 07/68%
	DATA DO CERTAME: 12/12/2024	SEINFRA: 203488 COM DESIGNAÇÃO 203488 COM DESIGNAÇÃO	MEB: 07/2024
	LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	PROFISPA: 3030VA COM DESIGNAÇÃO 3030VA COM DESIGNAÇÃO	08/2024
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE			

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
86267	SINAPI	H	0,77910000	R\$ 25,21	R\$ 19,64
86316	SINAPI	H	0,43840000	R\$ 20,11	R\$ 8,82
TOTAL MIO de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,46
VALOR:					R\$ 361,41

10.2. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10082	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,00	R\$ 7,00
18636	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 219,94	R\$ 219,94
18651	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 486,04	R\$ 486,04
11091	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,85	R\$ 15,85
11180	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 9,25	R\$ 0,14
11262	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,11	R\$ 6,11
11516	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 7,50	R\$ 0,75
11579	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,51	R\$ 13,02
TOTAL Material:					R\$ 748,85
MIO de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
12320	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,48	R\$ 70,44
TOTAL MIO de Obra:					R\$ 127,74
VALOR:					R\$ 876,59

10.3. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10796	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,00	R\$ 5,00
11150	SEINFRA	M	0,35000000	R\$ 0,25	R\$ 0,09
TOTAL Material:					R\$ 5,09
MIO de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12320	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,48	R\$ 5,87
TOTAL MIO de Obra:					R\$ 5,87
VALOR:					R\$ 10,96

10.4. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18670	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,37	R\$ 15,37
TOTAL Material:					R\$ 15,37
MIO de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
12543	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,46	R\$ 5,54
TOTAL MIO de Obra:					R\$ 17,62
VALOR:					R\$ 32,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA - CENTRO DE ESPORTES, CANTINA E PAVILÃO DE TRABALHO N.º 10855/10-22.	DATA:	06/12/2024	BDI:	24,52%
	CERTAME:	JUN-CP003/2024	FONTE:	SEINFRA	REDES:	100003
	DATA DO CERTAME:	17/12/2024	SEINFRA:	2024 COM DESONERACAO	REDES:	47,8%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	20248 COM DESONERACAO	REDES:	47,8%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	PROFRA	REDES:	0,00%

TOTAL Milão de Oros	R\$ 12,08
VALOR:	R\$ 27,45

10.5. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18971 SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,00000000	R\$ 22,47	R\$ 22,47
TOTAL Material:				R\$ 22,47

10.6. 86943 LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 35CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00000000	R\$ 9,06	R\$ 9,06
86904 LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00000000	R\$ 109,92	R\$ 109,92
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00000000	R\$ 9,58	R\$ 9,58
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00000000	R\$ 52,28	R\$ 52,28
86979 VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00000000	R\$ 8,05	R\$ 8,05
TOTAL Material:				R\$ 188,99
VALOR:				R\$ 188,99

11.1. C2722 DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 C/IMPEDZA DA CAIXA (UN)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	H	0,07000000	R\$ 23,48	R\$ 15,73
12380 MOTORISTA	H	0,07000000	R\$ 18,83	R\$ 12,92
12543 SERVENTE	H	0,07000000	R\$ 15,48	R\$ 10,73
TOTAL Milão de Oros				R\$ 40,72
VALOR:				R\$ 40,72

11.2. C2934 RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO (UN)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAUVRO (C/P)	H	0,20000000	R\$ 64,31	R\$ 12,86
TOTAL Equipamento, Custo Instalacão:				R\$ 12,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA - CENTRO DE ESPORTES, CANTINA E PAVILÃO DE TRABALHO N.º 10855/10-22.	DATA:	16/12/2024	BDI:	24,52%
	CERTAME:	JUN-CP003/2024	FONTE:	SEINFRA	REDES:	100003
	DATA DO CERTAME:	12/12/2024	SEINFRA:	20248 COM DESONERACAO	REDES:	47,8%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	20248 COM DESONERACAO	REDES:	47,8%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	PROFRA	REDES:	0,00%

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TUDO COMUM CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,48000000	R\$ 107,57	R\$ 51,63
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, TRACAO 1:3	M3	0,02500000	R\$ 493,15	R\$ 12,33
C0123 REBOCO CARGAMASSA DE CAL - HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACAO 1:3 ESP=6 mm PPAREDE	M2	0,48000000	R\$ 26,25	R\$ 12,42
TOTAL Material:				R\$ 76,38
VALOR:				R\$ 84,94

12.1. C2097 RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") (M)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,60000000	R\$ 19,10	R\$ 11,46
12320 ENCANADOR	H	0,20000000	R\$ 23,48	R\$ 4,70
TOTAL Milão de Oros				R\$ 16,16
VALOR:				R\$ 16,16

12.2. C1045 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDOS SI REAPROVEITAMENTO (M3)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
12543 SERVENTE	H	3,00000000	R\$ 16,46	R\$ 50,38
TOTAL Milão de Oros				R\$ 62,63
VALOR:				R\$ 62,63

12.3. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00800000	R\$ 57,90	R\$ 0,46
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,57000000	R\$ 0,67	R\$ 0,38
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	2,84000000	R\$ 1,39	R\$ 3,94
11222 GRADE DE FERRO	M2	1,00000000	R\$ 75,29	R\$ 75,29
TOTAL Material:				R\$ 77,52

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 72,48
12543 SERVENTE	H	3,00000000	R\$ 16,46	R\$ 50,38
TOTAL Milão de Oros				R\$ 122,86
VALOR:				R\$ 206,39

12.4. C4760 TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA PI/ESGOTO D=100mm (M)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00740000	R\$ 43,90	R\$ 0,32
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01130000	R\$ 42,27	R\$ 0,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE RESPASSE Nº 8974820204/ME BPC/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 10936 (14-22)		DATA: 06/12/2024		BOI: 24,52%	MES	IMP.
CERTAME: JUN-CP002024	FONTE: SEINFRA	VERBA: 021 COM DESONERACAO	74,64%	47,48%	10/2024	
DATA DO CERTAME: 12/12/2024	SEINFRA: 20344 COM DESONERACAO	20344 COM DESONERACAO	84,64%	47,48%	07/2024	
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	SINAPI: 25181 COM DESONERACAO	25181 COM DESONERACAO	85,98%	47,27%	06/2024	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	PROPOSTA: 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

86205	TUBO PVC ESGOTO SERIE R, 80 DN 100	M	SEINFRA	1,10000000	R\$ 33,91	R\$ 37,30
					TOTAL Material	R\$ 38,10

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	R\$ 11,46	R\$ 11,46
12220	R\$ 14,09	R\$ 14,09
TOTAL Mão de Obra		R\$ 25,55
VALOR		R\$ 63,65

13.1.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 (M)

80356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	SEINFRA	1,02000000	R\$ 1,46	R\$ 1,49
					TOTAL Material	R\$ 1,49

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	R\$ 19,10	R\$ 19,10
12312	R\$ 2,66	R\$ 2,66
TOTAL Mão de Obra		R\$ 4,76
VALOR		R\$ 6,25

13.1.2. C4848 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

89428	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 26,08	R\$ 26,08
					TOTAL Material	R\$ 26,08

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	R\$ 19,10	R\$ 19,10
12312	R\$ 22,92	R\$ 22,92
TOTAL Mão de Obra		R\$ 11,90
VALOR		R\$ 77,98

13.1.3. 81936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	SINAPI	1,20000000	R\$ 3,41	R\$ 3,41
					TOTAL Material	R\$ 3,41

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86247	R\$ 4,76	R\$ 4,76
86264	R\$ 5,83	R\$ 5,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 10,59
VALOR		R\$ 14,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE RESPASSE Nº 8974820204/ME BPC/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 10936 (14-22)		DATA: 06/12/2024		BOI: 24,52%	MES	IMP.
CERTAME: JUN-CP002024	FONTE: SEINFRA	VERBA: 021 COM DESONERACAO	74,64%	47,48%	10/2024	
DATA DO CERTAME: 12/12/2024	SEINFRA: 20344 COM DESONERACAO	20344 COM DESONERACAO	84,64%	47,48%	07/2024	
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	SINAPI: 25181 COM DESONERACAO	25181 COM DESONERACAO	85,98%	47,27%	06/2024	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	PROPOSTA: 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

86432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 1,54	R\$ 1,54
					TOTAL Material	R\$ 1,54

13.1.4. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,15000000	R\$ 18,10	R\$ 2,67
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,62
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 6,49
					VALOR	R\$ 8,13

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	R\$ 18,10	R\$ 18,10
12312	R\$ 24,15	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra		R\$ 6,49
VALOR		R\$ 8,13

13.1.5. 92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 4,89	R\$ 4,89
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 5,37	R\$ 5,37
					TOTAL Material	R\$ 10,46

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86247	R\$ 21,46	R\$ 21,46
86264	R\$ 26,28	R\$ 26,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 23,20
VALOR		R\$ 33,66

13.1.6. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)


19106	ESPELHOPLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 2,41	R\$ 2,41
19107	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHOPLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALACOES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	SEINFRA	2,00000000	R\$ 3,87	R\$ 7,74
					TOTAL Material	R\$ 11,16

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	R\$ 19,10	R\$ 19,10
12312	R\$ 24,15	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra		R\$ 12,54
VALOR		R\$ 23,59

13.1.7. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,25000000	R\$ 19,10	R\$ 5,54
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,25000000	R\$ 24,15	R\$ 7,00
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,54
					VALOR	R\$ 23,59



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 89914922020AMSP/CAJUA E PLANO DE TRABALHO Nº 1000810-22.	DATA:	06/12/2024	BDI:	24,52%
	CERTAME:	JUN-CP0032024	FORTE:	SEINFRA	VERBA:	RECURSOS
	DATA DO CERTAME:	12/12/2024	SEINFRA:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS

12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,000000000	RS 6,49	RS 6,49
Módulo de Obra						RS 6,49
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,210000000	RS 19,10	RS 4,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,210000000	RS 24,15	RS 5,07
TOTAL Módulo de Obra						RS 9,08
VALOR:						RS 15,56

13.1.8. C1484 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,000000000	RS 5,85	RS 5,85
Módulo de Obra						RS 5,85
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,210000000	RS 19,10	RS 4,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,210000000	RS 24,15	RS 5,07
TOTAL Módulo de Obra						RS 9,08
VALOR:						RS 14,93

13.1.9. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,000000000	RS 10,32	RS 10,32
Módulo de Obra						RS 10,32
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,370000000	RS 19,10	RS 7,07
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,370000000	RS 24,15	RS 8,94
TOTAL Módulo de Obra						RS 16,01
VALOR:						RS 26,33

13.1.10. C1082 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

10080	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,000000000	RS 7,68	RS 7,68
Módulo de Obra						RS 7,68
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000000	RS 19,10	RS 5,73
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000000	RS 24,15	RS 7,25
TOTAL Módulo de Obra						RS 12,98
VALOR:						RS 20,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 89914922020AMSP/CAJUA E PLANO DE TRABALHO Nº 1000810-22.	DATA:	06/12/2024	BDI:	24,52%
	CERTAME:	JUN-CP0032024	FORTE:	SEINFRA	VERBA:	RECURSOS
	DATA DO CERTAME:	12/12/2024	SEINFRA:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS

13.1.11. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)	SEINFRA	UN	1,000000000	RS 7,68	RS 7,68	
Módulo de Obra						RS 7,68
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000000	RS 19,10	RS 5,73
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000000	RS 24,15	RS 7,25
TOTAL Módulo de Obra						RS 12,98
VALOR:						RS 20,66

13.1.12. 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (M)

00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,017700000	RS 2,69	RS 2,74
Módulo de Obra com Encargos Complementares						RS 2,74
86247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,134000000	RS 21,46	RS 2,88
86264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,134000000	RS 25,28	RS 3,52
TOTAL Módulo de Obra com Encargos Complementares						RS 6,40
VALOR:						RS 9,14


13.1.13. C2088 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 32X32X32X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	RS 28,63	RS 28,63
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	RS 26,16	RS 26,16
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	RS 23,28	RS 23,28
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 32X32X32X95MM	SEINFRA	UN	1,000000000	RS 94,80	RS 94,80
TOTAL Módulo de Obra						RS 174,87


10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,000000000	RS 19,10	RS 57,30
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,000000000	RS 24,15	RS 72,45
TOTAL Módulo de Obra						RS 129,75
VALOR:						RS 304,62

13.1.14. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X32X32X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	RS 28,63	RS 28,63
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	RS 25,16	RS 25,16
TOTAL Módulo de Obra						RS 53,79
VALOR:						RS 304,62



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

 <p>ConstruVasp CONSTRUTORA</p>	OBRA:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSASSA - 502148/2024/ADMINISTRATIVA E PLANO DE TRABALHO N° 1003810-22	DATA:	06/12/2024	BDI:	24,52%	
	CERTAME:	JUL-CP03/2024	TIPO:	VERBAIS	NOVA	REI	
	DATA DO CERTAME:	12/12/2024	SEINFRA:	20244 COM DESIGNAÇÃO	84,4%	47,4%	19/2024
	LOCAL:	NOVA RUSSASSA - CE	SEINFRA:	20248 COM DESIGNAÇÃO	83,0%	47,4%	09/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSA - CE	SEINFRA:	PROFRA	0,0%	0,0%	0,0%

10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,28	R\$ 23,28
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 77,76	R\$ 77,76
					TOTAL Material:	R\$ 101,04

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 35,20
12312	ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 48,30
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 83,50
VALOR:				R\$ 244,33

13.1.15. C1665 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 202W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,83	R\$ 44,83
					TOTAL Material:	R\$ 44,83

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 19,10
12312	ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 26,67
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 45,77
VALOR:				R\$ 92,41

13.2.1. 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)

00039244	ELETRDUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SEINFRA	M	1,01700000	R\$ 2,74	R\$ 2,74
					TOTAL Material:	R\$ 2,74


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13400000	R\$ 2,08
89284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13400000	R\$ 3,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 5,60
VALOR:				R\$ 8,34

13.2.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

10336	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
					TOTAL Material:	R\$ 1,48

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 2,10
12312	ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 2,66
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 4,76

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

 <p>ConstruVasp CONSTRUTORA</p>	OBRA:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSASSA - 502148/2024/ADMINISTRATIVA E PLANO DE TRABALHO N° 1003810-22	DATA:	06/12/2024	BDI:	21,00%	
	CERTAME:	JUL-CP03/2024	TIPO:	VERBAIS	NOVA	REI	
	DATA DO CERTAME:	12/12/2024	SEINFRA:	20244 COM DESIGNAÇÃO	84,4%	47,4%	19/2024
	LOCAL:	NOVA RUSSASSA - CE	SEINFRA:	20248 COM DESIGNAÇÃO	82,3%	47,4%	09/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSA - CE	SEINFRA:	PROFRA	0,0%	0,0%	0,0%

VALOR:	R\$ 8,25
--------	----------

13.2.3. 92022 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (UN)

00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,89	R\$ 4,89
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,57	R\$ 5,57
					TOTAL Material:	R\$ 10,46

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48500000	R\$ 21,46
89284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48500000	R\$ 26,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 73,20
VALOR:				R\$ 33,66

13.2.4. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,64	R\$ 1,64
					TOTAL Material:	R\$ 1,64

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 19,10
12312	ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,13
VALOR:				R\$ 8,13

13.2.5. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

10183	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,63	R\$ 28,63
10154	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,16	R\$ 28,16
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,28	R\$ 23,28
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 77,76	R\$ 77,76
					TOTAL Material:	R\$ 197,83

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 38,20
12312	ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 48,30
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 198,50
VALOR:				R\$ 244,33

13.2.6. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 38,20	R\$ 38,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 48,30	R\$ 48,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 198,50
					VALOR:	R\$ 244,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ConstruVasp
CONSTRUTORA

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPARO N° 85916502/ALMESPICADA E PLANO DE TRABALHO N° 10636 10-22.
CERTAME: JUL/CP0032024
DATA DO CERTAME: 17/12/2024
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

DATA: 06/12/2024
FONTE: SENFRA UN
VERBA: 081 COM DESONERACAO 84,41%
BOJO MOVO: 20008 COM DESONERACAO 85,80%
INSCRIÇÃO: 0,00%
BDI: 24,32%
MOP: 47,40%
MOP: 47,40%
MOP: 47,40%
MOP: 47,40%

10680	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,68	R\$ 7,68	R\$ 7,68
					TOTAL Material	R\$ 7,68	R\$ 7,68
Valor: R\$ 20,96							
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73	R\$ 5,73	R\$ 5,73
12312	ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25	R\$ 7,25	R\$ 7,25
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,98	R\$ 12,98
					VALOR:	R\$ 20,96	R\$ 20,96

13.2.7. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
10681	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00000000	R\$ 7,68	R\$ 7,68	R\$ 7,68	R\$ 7,68
					TOTAL Material	R\$ 7,68	R\$ 7,68

Mão de Obra

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73	R\$ 5,73	R\$ 5,73
12312	ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25	R\$ 7,25	R\$ 7,25
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,98	R\$ 12,98
					VALOR:	R\$ 20,66	R\$ 20,66

13.2.8. C4111 LUMINÁRIA APLICADA NAS PAREDES EXPOSITOAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO (UN)

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
17952	LUMINÁRIA APLICADA NAS PAREDES EXPOSITOAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO	UN	1,00000000	R\$ 188,38	R\$ 188,38	R\$ 188,38	R\$ 188,38
					TOTAL Material	R\$ 188,38	R\$ 188,38

Mão de Obra

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,50000000	R\$ 19,10	R\$ 28,65	R\$ 28,65	R\$ 28,65
12312	ELETRICISTA	H	1,50000000	R\$ 24,15	R\$ 36,23	R\$ 36,23	R\$ 36,23
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 64,88	R\$ 64,88
					VALOR:	R\$ 253,27	R\$ 253,27

13.3.1. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
10057	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47	R\$ 2,47	R\$ 2,47
					TOTAL Material	R\$ 2,47	R\$ 2,47

Mão de Obra

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 19,10	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 2,29
12312	ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 24,15	R\$ 2,90	R\$ 2,90	R\$ 2,90
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 5,19	R\$ 5,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ConstruVasp
CONSTRUTORA

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPARO N° 85916502/ALMESPICADA E PLANO DE TRABALHO N° 10636 10-22.
CERTAME: JUL/CP0032024
DATA DO CERTAME: 17/12/2024
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

DATA: 06/12/2024
FONTE: SENFRA UN
VERBA: 081 COM DESONERACAO 84,41%
BOJO MOVO: 20008 COM DESONERACAO 85,80%
INSCRIÇÃO: 0,00%
BDI: 24,32%
MOP: 47,40%
MOP: 47,40%
MOP: 47,40%
MOP: 47,40%

13.3.2. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
10058	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,00000000	R\$ 2,88	R\$ 2,88	R\$ 2,88	R\$ 2,88
					TOTAL Material	R\$ 2,88	R\$ 2,88

Mão de Obra

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 19,10	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 2,48
12312	ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 24,15	R\$ 3,14	R\$ 3,14	R\$ 3,14
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 5,62	R\$ 5,62
					VALOR:	R\$ 8,50	R\$ 8,50

13.3.3. 101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
00012043	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	UN	1,00000000	R\$ 742,13	R\$ 742,13	R\$ 742,13	R\$ 742,13
					TOTAL Material	R\$ 742,13	R\$ 742,13

Mão de Obra

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63420000	R\$ 21,46	R\$ 13,61	R\$ 13,61	R\$ 13,61
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63420000	R\$ 25,26	R\$ 16,07	R\$ 16,07	R\$ 16,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 30,28	R\$ 30,28

Mão de Obra

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
87587	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA PARA EMBOCALASSA (UNIFORMIZANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO) PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,01940000	R\$ 550,61	R\$ 10,68	R\$ 10,68	R\$ 10,68
					TOTAL Serviço	R\$ 10,68	R\$ 10,68
					VALOR:	R\$ 783,27	R\$ 783,27

13.3.4. 00002686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA (M)

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	M	1,00000000	R\$ 22,95	R\$ 22,95	R\$ 22,95	R\$ 22,95
					TOTAL Material	R\$ 22,95	R\$ 22,95
					VALOR:	R\$ 22,95	R\$ 22,95

13.3.5. 00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA (M)

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	Total	Total
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	1,00000000	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ 12,54
					TOTAL Material	R\$ 12,54	R\$ 12,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPARO Nº 89/18/2020/AMESP/CAEAL E PLANO DE TRABALHO Nº 103510-22	DATA:	16/12/2024	BDI:	24,52%
CERTAME:	JUV-CP0032024	FONTE:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
DATA DO CERTAME:	19/02/2024	SEINFRA:	100% COM DEDUÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	20000 COM DEDUÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	20000 COM DEDUÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS

VALOR:	R\$ 17,54
--------	-----------

13.3.5. 00002683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002683	M	1,00000000	R\$ 36,15	R\$ 36,15
TOTAL Material				R\$ 36,15
VALOR:				R\$ 36,15

13.3.7. 00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	M	1,00000000	R\$ 5,24	R\$ 5,24
TOTAL Material				R\$ 5,24
VALOR:				R\$ 5,24

13.3.8. 00611 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA PILIGÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00611	H	0,16000000	R\$ 24,16	R\$ 3,87
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,87

13.3.9. C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0076	M2	0,80000000	R\$ 107,57	R\$ 86,06
0076	KG	0,75000000	R\$ 9,74	R\$ 7,60
0088	M3	0,04830000	R\$ 304,66	R\$ 17,61
0090	M3	0,02520000	R\$ 382,38	R\$ 9,64
C1409	M2	0,18000000	R\$ 71,07	R\$ 11,93
C2123	M2	0,96000000	R\$ 25,25	R\$ 24,24
TOTAL Material				R\$ 157,08
VALOR:				R\$ 160,95

13.3.9. C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17381	UN	1,00000000	R\$ 5,04	R\$ 5,04
17390	UN	1,00000000	R\$ 51,66	R\$ 51,66
TOTAL Material				R\$ 56,72

13.3.10. 00521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00521	M	1,02000000	R\$ 34,46	R\$ 35,15
TOTAL Material				R\$ 35,15
VALOR:				R\$ 130,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPARO Nº 89/18/2020/AMESP/CAEAL E PLANO DE TRABALHO Nº 103510-22	DATA:	16/12/2024	BDI:	24,52%
CERTAME:	JUV-CP0032024	FONTE:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
DATA DO CERTAME:	19/02/2024	SEINFRA:	100% COM DEDUÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	20000 COM DEDUÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	20000 COM DEDUÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS

VALOR:	R\$ 130,00
--------	------------

13.3.10. 00521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00461	M	1,02000000	R\$ 34,46	R\$ 35,15
TOTAL Material				R\$ 35,15
VALOR:				R\$ 130,00

13.3.11. C4208 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00462	H	0,31000000	R\$ 19,10	R\$ 5,92
02312	H	0,31000000	R\$ 24,15	R\$ 7,49
TOTAL Mão de Obra				R\$ 13,41
VALOR:				R\$ 48,56

13.3.11. C4208 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00463	UN	1,00000000	R\$ 126,93	R\$ 126,93
00327	CJ	1,00000000	R\$ 744,87	R\$ 744,87
00520	M	20,00000000	R\$ 33,75	R\$ 675,00
C1790	UN	1,00000000	R\$ 741,18	R\$ 741,18
C2060	UN	1,00000000	R\$ 126,92	R\$ 126,92
C2066	UN	1,00000000	R\$ 154,85	R\$ 154,85
TOTAL Material				R\$ 2.881,75
VALOR:				R\$ 2.881,75

13.3.12. C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. DATE 259A (UN)


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00994	UN	1,00000000	R\$ 1.579,02	R\$ 1.579,02
TOTAL Material				R\$ 1.579,02

13.3.12. C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. DATE 259A (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00462	UN	2,00000000	R\$ 19,10	R\$ 38,20
02312	UN	2,00000000	R\$ 24,15	R\$ 48,30
TOTAL Mão de Obra				R\$ 86,50
VALOR:				R\$ 1.665,52

13.3.13. 88111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	UN	1,00000000	R\$ 23,36	R\$ 23,36
TOTAL				R\$ 23,36

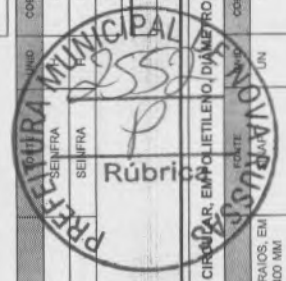

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 851482024/2024/EMP/CLAMPA E PLANO DE TRABALHO N° 1091810-22.	DATA:	06/12/2024	BDI: 24,02%
	CERTAME:	JUV.CP003/2024	EMPRESA:	SEINFRA	VERBA:
	DATA DO CERTAME:	12/12/2024	OBJETO:	20246 COM DESCOMBORAÇÃO	84,84%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	PROPOSTA:	326468 COM DESCOMBORAÇÃO	84,84%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE			8,00%
					0,00%

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8009	H	1	0,13640000	R\$ 25,97	R\$ 3,56
8016	H	1	0,10680000	R\$ 20,11	R\$ 2,19
				TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares	R\$ 5,75
				TOTAL MATERIAL	R\$ 26,36

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	M3	1	0,01410000	R\$ 217,07	R\$ 3,06
				TOTAL Serviço	R\$ 3,06
				VALOR:	R\$ 37,20

13.3.14. C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	UN	1	1,00000000	R\$ 41,66	R\$ 41,66
				TOTAL Material	R\$ 41,66
				TOTAL	R\$ 41,66

13.3.15. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11005	UN	1	1,00000000	R\$ 41,66	R\$ 41,66
				TOTAL Material	R\$ 41,66
				TOTAL	R\$ 41,66

13.3.16. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10080	UN	1	1,00000000	R\$ 7,66	R\$ 7,66
				TOTAL Material	R\$ 7,66
				TOTAL	R\$ 7,66

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	1	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12312	H	1	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
				TOTAL Mês de Obra	R\$ 12,98
				VALOR:	R\$ 80,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 851482024/2024/EMP/CLAMPA E PLANO DE TRABALHO N° 1091810-22.	DATA:	06/12/2024	BDI: 24,02%
	CERTAME:	JUV.CP003/2024	EMPRESA:	SEINFRA	VERBA:
	DATA DO CERTAME:	12/12/2024	OBJETO:	20246 COM DESCOMBORAÇÃO	84,84%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	PROPOSTA:	326468 COM DESCOMBORAÇÃO	84,84%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE			8,00%
					0,00%

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008	UN	1	1,00000000	R\$ 41,66	R\$ 41,66
				TOTAL Material	R\$ 41,66
				TOTAL	R\$ 41,66

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	1	0,90000000	R\$ 19,10	R\$ 17,19
12312	H	1	0,90000000	R\$ 24,15	R\$ 21,74
				TOTAL Mês de Obra	R\$ 38,93
				VALOR:	R\$ 80,59

13.3.17. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008	UN	1	1,00000000	R\$ 41,66	R\$ 41,66
				TOTAL Material	R\$ 41,66
				TOTAL	R\$ 41,66

13.3.18. C2051 PROJETO C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W C/FOTOCÉLULA (UN)

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10622	UN	1	1,00000000	R\$ 30,85	R\$ 30,85
11483	UN	1	1,00000000	R\$ 190,04	R\$ 190,04
10464	UN	1	1,00000000	R\$ 69,47	R\$ 69,47
11777	UN	1	1,00000000	R\$ 246,86	R\$ 246,86
				TOTAL Material	R\$ 537,22
				TOTAL	R\$ 537,22

13.3.19. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	M	1	1,02000000	R\$ 7,88	R\$ 8,04
				TOTAL Material	R\$ 8,04
				TOTAL	R\$ 8,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUVASP

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 5591487024/EMPRESA E PLANO DE TRABALHO Nº 1060810-22
 DATA: 06/12/2024
 BDI: 24,32%
 FORTES: SEINFRA 84,4% MES 47,48% RES 10/2024
 SICO/POC 20248 COM DESEMBOLSO 86,96% 47,87% 06/2024
 SINAPI 20248 COM DESEMBOLSO 0,00% 0,00% 0,00%

CERTAME: JUV-CP0032024
 DATA DO CERTAME: 12/12/2024
 LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

10330	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 24,10	R\$ 24,67
					TOTAL Material:	R\$ 24,67
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,10	R\$ 4,61
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,15	R\$ 5,07
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,68
					VALOR:	R\$ 34,75

14.1. C1465 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO (M2)

10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE M 1	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 3,20	R\$ 4,80
10804	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEG. ULTRA RÁPIDO	SEINFRA	KG	1,60000000	R\$ 14,34	R\$ 22,94
11488	LÍQUIDO SELADOR IF	SEINFRA	L	0,70000000	R\$ 4,95	R\$ 3,47
					TOTAL Material:	R\$ 31,21
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,66
					VALOR:	R\$ 40,87

14.2. C4072 PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMÃOS (M2)

17557	SIKA TOP 107 CX	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 2,65	R\$ 5,30
					TOTAL Material:	R\$ 5,30
Mão de Obra						
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,04
					VALOR:	R\$ 11,34

15.1. C0589 CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

12486	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 1,02	R\$ 0,46
					TOTAL Material:	R\$ 0,46
Mão de Obra						
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,25
					VALOR:	R\$ 7,71

15.2. 86487 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023 (M2)

CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D)
 Bairro: CENTRO | CEP: 62016-000 | Sobral/CE
 construvase@hotmail.com | (85) 99701-2524

Página: 34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUVASP

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 5591487024/EMPRESA E PLANO DE TRABALHO Nº 1060810-22
 DATA: 09/12/2024
 BDI: 24,32%
 FORTES: SEINFRA 84,4% MES 47,48% RES 10/2024
 SICO/POC 20248 COM DESEMBOLSO 86,96% 47,87% 06/2024
 SINAPI 20248 COM DESEMBOLSO 0,00% 0,00% 0,00%

CERTAME: JUV-CP0032024
 DATA DO CERTAME: 12/12/2024
 LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,06020000	R\$ 0,48	R\$ 0,04
00043625	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33930000	R\$ 1,43	R\$ 1,01
					TOTAL Material:	R\$ 1,95
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 27,47	R\$ 9,92
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 20,11	R\$ 2,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,34
					VALOR:	R\$ 14,39

15.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 (M2)

00007356	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22660000	R\$ 21,88	R\$ 5,00
					TOTAL Material:	R\$ 5,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 27,47	R\$ 4,48
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 20,11	R\$ 1,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,57
					VALOR:	R\$ 10,57

15.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 14,06	R\$ 0,70
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 8,85	R\$ 1,06
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,46	R\$ 0,12
12097	TINTA LÁTEX ACRILICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 15,38	R\$ 2,61
					TOTAL Material:	R\$ 4,46
Mão de Obra						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,16	R\$ 0,00
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,35
					VALOR:	R\$ 20,84

15.5. C3467 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARA PÓRTAL DE 4M x 1" (UN)

10737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,36
					VALOR:	R\$ 0,36

CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D)
 Bairro: CENTRO | CEP: 62016-000 | Sobral/CE
 construvase@hotmail.com | (85) 99701-2524

Página: 35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA ESTRUTURA MUNICIPAL DE FERRÃO DE NOVA RUSSAS - DE CONDIÇÃO CONTRATO DE REPARO	DATA:	06/12/2024	BOI:	34.52%
CERTAME:	JVM-CP003/2024	SEINFRA:	08% COM DESONERACAO	NOVA:	10/20%
DATA DO CERTAME:	12/12/2024	SICRO NOVO:	20248	MES:	10/2024
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	20248 COM DESONERACAO	NOVA:	07/2024
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	PROPOSTA:	08,00%	NOVA:	08/2024
		PROPOSTA:	0,00%	NOVA:	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11006 BRUCA DE WIDÇA DE 1"	UN	0,25000000	R\$ 60,27	R\$ 16,57
10690 CHUMBADOR TIPO PARABOLIZ 3/4" X 1"	UN	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
TOTAL Material:				R\$ 19,96
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	2,00000000	R\$ 19,10	R\$ 38,20
11530 MONTADOR	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 62,36
VALOR:				R\$ 82,68

15.6. 100759 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020 - PE (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006516 DILUENTE AGUARRAS	L	0,12400000	R\$ 13,36	R\$ 1,72
00007292 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,13400000	R\$ 75,92	R\$ 10,34
TOTAL Material:				R\$ 12,06
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86510 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06310000	R\$ 27,47	R\$ 28,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 28,93
VALOR:				R\$ 40,99

15.7. C1811 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,22500000	R\$ 1,48	R\$ 0,37
12087 TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	L	0,15000000	R\$ 28,62	R\$ 4,29
12158 TRINCHA 2"	UN	0,08000000	R\$ 2,80	R\$ 0,22
TOTAL Material:				R\$ 4,88
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,22000000	R\$ 19,10	R\$ 3,87
12186 PINTOR	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,48
VALOR:				R\$ 18,36

16.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	R\$ 18,46	R\$ 12,92
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,92
VALOR:				R\$ 12,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FERRÃO DE NOVA RUSSAS - DE CONDIÇÃO CONTRATO DE REPARO	DATA:	06/12/2024	BOI:	24,52%
CERTAME:	JVM-CP003/2024	SEINFRA:	08% COM DESONERACAO	NOVA:	47,48%
DATA DO CERTAME:	12/12/2024	SICRO NOVO:	20248	NOVA:	07/2024
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA:	20248 COM DESONERACAO	NOVA:	47,47%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	PROPOSTA:	8,00%	NOVA:	0,00%
		PROPOSTA:	0,00%	NOVA:	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA-JUNIOR (MENSALISTA)	MES	1,00000000	R\$ 17.721,87	R\$ 17.721,87
00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,00000000	R\$ 5.672,24	R\$ 5.672,24
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 23.394,11
VALOR:				R\$ 23.394,11

COMP_NR_02 EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM (MATERIAL COMPOSTO POR ALUMÍNIO) (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143231 Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	m²	1,10000000	R\$ 118,05	R\$ 129,86
11566 PARAFUSO - 6MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN	5,09000000	R\$ 0,62	R\$ 3,16
18609 PERFIL DE ALUMÍNIO 2" (50x50)	M	1,72000000	R\$ 21,57	R\$ 37,10
11783 REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM	UN	5,09000000	R\$ 0,10	R\$ 0,51
TOTAL Material:				R\$ 170,63
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,76000000	R\$ 19,10	R\$ 14,52
11568 SERRALHEIRO	H	0,76000000	R\$ 24,16	R\$ 18,36
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 32,88
VALOR:				R\$ 203,51



Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA 040937349. Data: 2024.12.10 14:52:14 -03'00'

Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO 62406094391. Data: 2024.12.10 14:57:23 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ConstruVasp
CONSTRUTORA

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPARSE Nº 859.495/2024 (MENSALIDADE E PLANO DE TRABALHO Nº 109/2010-32)
DATA DO CERTAME: 12/12/2024
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

DATA: 06/12/2024
FONTE: SEINFRA
M3: 24,52%
M4: 74,48%
M5: 1,00%

VERBA: 0281 COM DESIGNAÇÃO
M3: 84,6%
M4: 15,4%
M5: 0,0%

RECURSO: 20204 COM DESIGNAÇÃO
M3: 84,6%
M4: 15,4%
M5: 0,0%

PROPOSTA: 202048 COM DESIGNAÇÃO
M3: 84,6%
M4: 15,4%
M5: 0,0%

C0075 ALVENARIA DE TUILO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP-10 cm (M2)

Material	ÁREA MÉDIA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,33040000	R\$ 57,90	R\$ 176
10441	CAL HIDRATADA	KG	4,55000000	R\$ 0,67	R\$ 3,05
10665	CIMENTO PORTLAND	KG	4,55000000	R\$ 0,49	R\$ 2,23
12082	TUILO MACIÇO COMUM	UN	84,00000000	R\$ 0,33	R\$ 27,72
				TOTAL Material	R\$ 34,76

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDEREIRO	H	1,60000000	R\$ 24,16	
12543	SERVENTE	H	1,85000000	R\$ 18,46	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 42,62
				VALOR:	R\$ 107,57

C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CELULA FOTOELÉTRICA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10060	APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS	UN	1,00000000	R\$ 60,20	
10272	BRAÇADEIRA P/fixação APARELHO SINALIZADOR	UN	1,00000000	R\$ 1,85	
				TOTAL Material	R\$ 62,05

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,50000000	R\$ 19,10	
10312	ELETRICISTA	H	1,50000000	R\$ 24,15	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 43,25
				VALOR:	R\$ 125,93

C3130 AREA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Emprego em Códigos Específicos

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10596	CARRGADORA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00000000	R\$ 106,35	
10710	CARRGADORA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,01308689	R\$ 3,96	
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁVIMA E ESC. HP 165 (CHI)	H	0,00065444	R\$ 6,06	
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁVIMA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,01318444	R\$ 242,01	
				TOTAL Emprego em Códigos Específicos	R\$ 725

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	H	0,02777778	R\$ 18,46	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,51
				VALOR:	R\$ 7,74

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇÃO 1:4 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ConstruVasp
CONSTRUTORA

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPARSE Nº 859.495/2024 (MENSALIDADE E PLANO DE TRABALHO Nº 109/2010-32)
DATA DO CERTAME: 12/12/2024
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

DATA: 06/12/2024
FONTE: SEINFRA
M3: 24,52%
M4: 74,48%
M5: 1,00%

VERBA: 0281 COM DESIGNAÇÃO
M3: 84,6%
M4: 15,4%
M5: 0,0%

RECURSO: 20204 COM DESIGNAÇÃO
M3: 84,6%
M4: 15,4%
M5: 0,0%

PROPOSTA: 202048 COM DESIGNAÇÃO
M3: 84,6%
M4: 15,4%
M5: 0,0%

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇÃO 1:3 (M3)

Material	ÁREA MÉDIA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M3	1,21600000	R\$ 57,90	R\$ 70,41
10665	CIMENTO PORTLAND	KG	365,00000000	R\$ 0,49	R\$ 174,85
				TOTAL Material	R\$ 245,26

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	H	32,45000000	R\$ 18,46	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 599,03
				VALOR:	R\$ 844,29

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	ÁREA MÉDIA	M3	1,21600000	R\$ 57,90	
10665	CIMENTO PORTLAND	KG	488,00000000	R\$ 0,49	
				TOTAL Material	R\$ 306,95

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	H	10,00000000	R\$ 18,46	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 184,60
				VALOR:	R\$ 491,55

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOIMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF. 08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,16000000	R\$ 90,06	R\$ 104,47
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	115,40000000	R\$ 0,80	R\$ 93,12
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	261,89000000	R\$ 0,52	R\$ 136,18
				TOTAL Material	R\$ 333,77

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,11	R\$ 225,84	
				Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 225,84
				VALOR:	R\$ 559,61

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOIMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF. 08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,14000000	R\$ 90,06	R\$ 102,67
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	171,10000000	R\$ 0,80	R\$ 136,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	192,52000000	R\$ 0,52	R\$ 100,11
				TOTAL Material	R\$ 339,68

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,10000000	R\$ 20,11	
				TOTAL	R\$ 220,22

ORÇÃO		DATA: 09/12/2024		BOM: 24,52%	
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - DE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 8991492004MESP-CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 10088 15-22		BOM: 24,52%		BOM: 24,52%	
CERTAME: JUV-CP0032024		BOM: 24,52%		BOM: 24,52%	
DATA DO CERTAME: 10/12/2024		BOM: 24,52%		BOM: 24,52%	
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE		BOM: 24,52%		BOM: 24,52%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		BOM: 24,52%		BOM: 24,52%	
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 222,22		R\$ 222,22	
VALOR:		R\$ 582,90		R\$ 582,90	

ORÇÃO		DATA: 09/12/2024		BOM: 24,52%	
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - DE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 8991492004MESP-CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 10088 15-22		BOM: 24,52%		BOM: 24,52%	
CERTAME: JUV-CP0032024		BOM: 24,52%		BOM: 24,52%	
DATA DO CERTAME: 10/12/2024		BOM: 24,52%		BOM: 24,52%	
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE		BOM: 24,52%		BOM: 24,52%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		BOM: 24,52%		BOM: 24,52%	
TOTAL Mês de Obra:		R\$ 12,99		R\$ 12,99	
VALOR:		R\$ 27,46		R\$ 27,46	

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80169	KG	1,15000000	R\$ 5,28	R\$ 6,05
80103	KG	0,12000000	R\$ 11,45	R\$ 0,23
TOTAL Mensal:				R\$ 6,28

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80316	H	1,00000000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
TOTAL Serviço:				R\$ 0,55
VALOR:				R\$ 27,46

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	H	0,08000000	R\$ 19,10	R\$ 1,53
80121	H	0,08000000	R\$ 24,16	R\$ 1,93
TOTAL Mês de Obra:				R\$ 3,46
VALOR:				R\$ 9,74

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00049489	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 7,93
VALOR de Obra:				R\$ 11,39
VALOR:				R\$ 17,81

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10421	UN	3,00000000	R\$ 45,63	R\$ 136,89
10841	UN	3,00000000	R\$ 1,96	R\$ 5,88
11244	UN	3,00000000	R\$ 88,81	R\$ 266,43
12162	M	3,00000000	R\$ 50,18	R\$ 150,54
TOTAL Mensal:				R\$ 463,74
VALOR:				R\$ 9,74

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88225	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
TOTAL Serviço:				R\$ 1,17
VALOR:				R\$ 25,03

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	6,50000000	R\$ 19,10	R\$ 124,15
12312	H	6,50000000	R\$ 24,15	R\$ 156,98
TOTAL Mês de Obra:				R\$ 281,13
VALOR:				R\$ 744,87

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88226	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:				R\$ 0,29
VALOR:				R\$ 25,03

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043684	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 7,92
VALOR:				R\$ 11,39
VALOR:				R\$ 17,81

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88225	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
TOTAL Serviço:				R\$ 1,17
VALOR:				R\$ 25,03

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043684	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 7,92
VALOR:				R\$ 11,39
VALOR:				R\$ 17,81

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88225	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
TOTAL Serviço:				R\$ 1,17
VALOR:				R\$ 25,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇÃO: 06/12/2024
 BOM: 24,52%
 BOM: 10,00%
 BOM: 47,52%
 BOM: 07,00%
 BOM: 47,52%
 BOM: 5,00%

REGIÃO DO ESTADO MUNICIPAL DE FURTOS DE NOVA RUSSAS - CE. COMPONETE CONTRATO DE REPARTE Nº 999159/2022/AMESP/CAVALA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-32. JUN-CP03/2024

CERTAME: 12/12/2024

DATA DO CERTAME: 12/12/2024

LOCAL: NOVA RUSSAS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
89222	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
89223	H	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
89224	H	1,00000000	R\$ 2,32	R\$ 2,32
TOTAL Equipamento:				R\$ 5,13
VALOR:				R\$ 5,13

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023 (H)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	UN	0,00000000	R\$ 19,525,42	R\$ 1,17
TOTAL Equipamento:				R\$ 1,17
VALOR:				R\$ 1,17

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURORS, AF_05/2023 (H)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	UN	0,00001480	R\$ 19,525,42	R\$ 0,29
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,29
VALOR:				R\$ 0,28

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023 (H)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	UN	0,00007000	R\$ 19,525,42	R\$ 1,27
TOTAL Equipamento:				R\$ 1,27
VALOR:				R\$ 1,36

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023 (H)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	KWH	2,50250000	R\$ 0,95	R\$ 2,35
TOTAL Especial:				R\$ 2,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇÃO: 06/12/2024
 BOM: 24,52%
 BOM: 10,00%
 BOM: 47,52%
 BOM: 07,00%
 BOM: 47,52%
 BOM: 5,00%

REGIÃO DO ESTADO MUNICIPAL DE FURTOS DE NOVA RUSSAS - CE. COMPONETE CONTRATO DE REPARTE Nº 999159/2022/AMESP/CAVALA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-32. JUN-CP03/2024

CERTAME: 12/12/2024

DATA DO CERTAME: 12/12/2024

LOCAL: NOVA RUSSAS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
12701	H	1,27780000	R\$ 1,00	R\$ 1,28
12702	H	0,24210000	R\$ 1,00	R\$ 0,24
TOTAL Geral:				R\$ 22,81
VALOR:				R\$ 22,81

10660 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
12715	H	1,00000000	R\$ 3,89	R\$ 3,89
12701	H	1,27780000	R\$ 1,00	R\$ 1,28
12702	H	0,24210000	R\$ 1,00	R\$ 0,24
12700	H	0,67260000	R\$ 1,00	R\$ 0,67
TOTAL Geral:				R\$ 27,37
VALOR:				R\$ 27,37

10882 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
12701	H	2,86540000	R\$ 1,00	R\$ 2,87
12702	H	0,42620000	R\$ 1,00	R\$ 0,43
12703	H	1,19200000	R\$ 1,00	R\$ 1,19
TOTAL Geral:				R\$ 25,78
VALOR:				R\$ 25,18

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584	H	0,01583333	R\$ 84,41	R\$ 1,34
10708	H	0,02630333	R\$ 204,37	R\$ 5,28
10818	H	0,00000000	R\$ 310,52	R\$ 0,00
10732	H	0,04156867	R\$ 592,43	R\$ 24,68
10626	H	0,00000000	R\$ 33,97	R\$ 0,00
10740	H	0,04156867	R\$ 134,00	R\$ 5,57
TOTAL Equipamento Geral:				R\$ 36,97

CONSTRUVASF CONST & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Ruybal, 330 - Sítio - (203 D) Bairro: CENTRO | CEP: 62010-050 | Sobral-CE
 construvass@hotmail.com | (88) 99701-2524



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE. COMERCIAL CONTRATO DE RESCISÃO N.º 9591492023AMEPC/CA/ME E PLANO DE TRABALHO N.º 10366/18-22	DATA:	15/12/2024	BOM:	24,52%
CERTAME:	JAN-C/2023/2328	FORTE:	SEINFRA	100%	100%
DATA DO CERTAME:	15/12/2024	UNID:	M	1,00000000	RS 24,51
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	COEFICIENTE:	0,20843333	PREÇO UNITÁRIO:	RS 18,46
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	TOTAL Mês de Obra:		TOTAL:	RS 3,85

12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	RS 18.416,70	RS 7,37
				TOTAL Material:		RS 7,37

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20843333	RS 18,46	RS 3,85
				TOTAL Mês de Obra:		RS 3,85

12546	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	RS 36,58	RS 39,48
				TOTAL Serviço:	RS 39,48	
				VALOR:		RS 97,61

C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M)

10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	RS 24,19	RS 24,67
				TOTAL Material:		RS 24,67

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	RS 19,10	RS 4,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	RS 24,15	RS 5,07
				TOTAL Mês de Obra:		RS 9,28
				VALOR:		RS 33,75

C0558 CALHA EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

12466	SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,30000000	RS 1,02	RS 0,31
				TOTAL Material:		RS 0,31

12565	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	RS 24,16	RS 4,83
				TOTAL Mês de Obra:		RS 4,83
				VALOR:		RS 5,14

I0700 CAMINHONETE SAVERIO (CHP) (H)

12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVERIO	SEINFRA	H	1,00000000	RS 18,83	RS 18,83
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVERIO	SEINFRA	H	1,00000000	RS 34,21	RS 34,21
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	4,88340000	RS 1,00	RS 4,88
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,30820000	RS 1,00	RS 1,31
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,88340000	RS 1,00	RS 4,88
				TOTAL Geral:		RS 64,31
				VALOR:		RS 84,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE. COMERCIAL CONTRATO DE RESCISÃO N.º 9591492023AMEPC/CA/ME E PLANO DE TRABALHO N.º 10366/18-22	DATA:	15/12/2024	BOM:	24,52%
CERTAME:	JAN-C/2023/2328	FORTE:	SEINFRA	100%	100%
DATA DO CERTAME:	15/12/2024	UNID:	H	1,00000000	RS 24,51
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	COEFICIENTE:	28,65480000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 1,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	TOTAL Mês de Obra:		TOTAL:	RS 9,87

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH) (H)

12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	RS 24,51	RS 24,51
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,65480000	RS 1,00	RS 28,66
12702	JUROS	SEINFRA	H	9,87440000	RS 1,00	RS 9,87
				TOTAL Geral:		RS 62,84
				VALOR:		RS 92,85

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	RS 24,51	RS 24,51
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	RS 17,06	RS 17,06
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,65480000	RS 1,00	RS 28,66
12702	JUROS	SEINFRA	H	9,87440000	RS 1,00	RS 9,87
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	RS 1,00	RS 43,00
				TOTAL Geral:		RS 103,30
				VALOR:		RS 152,90

88282 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTACÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 3,38	RS 3,38
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,43	RS 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,34	RS 1,34
00043469	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,49	RS 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,04	RS 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,10	RS 1,10
				TOTAL Encargos Complementares:		RS 7,75

Mês de Obra

00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 17,61	RS 17,61
				TOTAL Mês de Obra:		RS 17,61

88330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

88330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	RS 25,00	RS 25,00
				TOTAL:		RS 25,00
				VALOR:		RS 25,00



CONSTRUVASF CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Central Rangel, 330 - São - (203 D)
Barro Centro | CEP: 62019-030 | Sobral/CE
construvasp@hotmail.com | (88) 96791-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - 8591892024/MESPECÍFICA E PLANO DE TRABALHO N.º 1039815-32
 DATA: 12/12/2024
 LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

ORÇAMENTO: 8591892024/MESPECÍFICA E PLANO DE TRABALHO N.º 1039815-32
 DATA: 12/12/2024
 LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,000000000		R\$ 28,81	R\$ 28,81
H	41,568000000		R\$ 1,00	R\$ 41,57
H	14,026200000		R\$ 1,00	R\$ 14,03
TOTAL Geral				R\$ 84,41
VALOR:				R\$ 84,41

10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

CH	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,000000000	R\$ 28,81
12701	DEPRECIACÃO	H	41,568000000	R\$ 41,57
12702	JUROS	H	14,026200000	R\$ 14,03
TOTAL Geral				R\$ 84,41
VALOR:				R\$ 84,41

10788 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

CH	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,000000000	R\$ 28,81
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,000000000	R\$ 57,51
12701	DEPRECIACÃO	H	41,568000000	R\$ 41,57
12702	JUROS	H	14,026200000	R\$ 14,03
12703	MANUTENÇÃO	H	62,350000000	R\$ 62,35
TOTAL Geral				R\$ 204,37
VALOR:				R\$ 204,37

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

CH	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,000000000	R\$ 28,81
12701	DEPRECIACÃO	H	57,371400000	R\$ 57,37
12702	JUROS	H	19,565400000	R\$ 19,57
TOTAL Geral				R\$ 105,35
VALOR:				R\$ 105,35

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

CH	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,000000000	R\$ 28,81
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,000000000	R\$ 59,42
12701	DEPRECIACÃO	H	57,371400000	R\$ 57,37
12702	JUROS	H	19,565400000	R\$ 19,57
12703	MANUTENÇÃO	H	86,657100000	R\$ 86,66
TOTAL Geral				R\$ 261,73
VALOR:				R\$ 261,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - 8591892024/MESPECÍFICA E PLANO DE TRABALHO N.º 1039815-32
 DATA: 12/12/2024
 LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

ORÇAMENTO: 8591892024/MESPECÍFICA E PLANO DE TRABALHO N.º 1039815-32
 DATA: 12/12/2024
 LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,000000000		R\$ 21,29	R\$ 21,29
H	9,083200000		R\$ 1,00	R\$ 9,08
H	2,007900000		R\$ 1,00	R\$ 2,01
TOTAL Geral				R\$ 32,38
VALOR:				R\$ 32,38

10512 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

CH	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,000000000	R\$ 21,29
12701	DEPRECIACÃO	H	9,083200000	R\$ 9,08
12702	JUROS	H	2,007900000	R\$ 2,01
TOTAL Geral				R\$ 32,38
VALOR:				R\$ 32,38

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

CH	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,000000000	R\$ 21,29
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,000000000	R\$ 3,03
12701	DEPRECIACÃO	H	6,083200000	R\$ 6,08
12702	JUROS	H	2,007900000	R\$ 2,01
12703	MANUTENÇÃO	H	11,479500000	R\$ 11,47
TOTAL Geral				R\$ 47,88
VALOR:				R\$ 47,88

19134 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF 08/2015 (CHI)

CH	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	R\$ 26,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 26,67

19134 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF 08/2015 (CHI)

CH	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO AF 08/2015	H	1,000000000	R\$ 0,82
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF 08/2015	H	1,000000000	R\$ 0,22
TOTAL Serviço				R\$ 1,04
VALOR:				R\$ 27,71

191533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF 08/2015 (CHP)

CH	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	R\$ 26,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 26,67
VALOR:				R\$ 26,67



CONSTRUVASP CONSTR. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 300 - Sala - (203 D)
 Bairro: Santa Cruz - Nova Russas - Ceará - CEP: 62010-030 | Sobral-CE
 construvasp@outlook.com | (85) 99701-2524

CONSTRUVASP CONSTR. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 300 - Sala - (203 D)
 Bairro: Santa Cruz - Nova Russas - Ceará - CEP: 62010-030 | Sobral-CE
 construvasp@outlook.com | (85) 99701-2524

ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA	REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 9591492024/AMESP/CAVIA E PLANO DE TRABALHO N° 1005819-32	DATA: 19/12/2024	MOI: 24,52%
	CERTAME	JUV-CP003/2024	OBRA	REPARO
	DATA DO CERTAME	19/12/2024	OBRA	REPARO
	LOCAL	NOVA RUSSAS - CE	OBRA	REPARO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	OBRA	REPARO

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
91530	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
91531	H	1,00000000	R\$ 1,03	R\$ 1,03
91532	H	1,00000000	R\$ 4,41	R\$ 4,41
TOTAL Equipamento				R\$ 6,48
VALOR:				R\$ 35,15

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00015458	UN	0,00000330	R\$ 15.517,01	R\$ 0,83
TOTAL Equipamento				R\$ 0,83
VALOR:				R\$ 0,82

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00015458	UN	0,00001430	R\$ 15.517,01	R\$ 0,22
TOTAL Equipamento				R\$ 0,22
VALOR:				R\$ 0,22

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00015458	UN	0,00006670	R\$ 15.517,01	R\$ 1,03
TOTAL Equipamento				R\$ 1,03
VALOR:				R\$ 1,03

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	L	1,00000000	R\$ 4,41	R\$ 4,41
TOTAL Material				R\$ 4,41
VALOR:				R\$ 4,41

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00614	CHI	1,00000000	R\$ 311,27	R\$ 311,27
VALOR:				R\$ 311,27

ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA	REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 9591492024/AMESP/CAVIA E PLANO DE TRABALHO N° 1005819-32	DATA: 19/12/2024	MOI: 24,52%
	CERTAME	JUV-CP003/2024	OBRA	REPARO
	DATA DO CERTAME	19/12/2024	OBRA	REPARO
	LOCAL	NOVA RUSSAS - CE	OBRA	REPARO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	OBRA	REPARO

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
12701	H	17,81990000	R\$ 1,00	R\$ 17,82
12702	H	5,94000000	R\$ 1,00	R\$ 5,94
TOTAL Equip.				R\$ 45,05
VALOR:				R\$ 45,05

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10728	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
12775	H	1,00000000	R\$ 48,79	R\$ 48,79
12701	H	17,81990000	R\$ 1,00	R\$ 17,82
12702	H	5,94000000	R\$ 1,00	R\$ 5,94
12703	H	19,79890000	R\$ 1,00	R\$ 19,80
TOTAL Equip.				R\$ 113,64
VALOR:				R\$ 113,64

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80226	CHI	0,64520000	R\$ 1,45	R\$ 0,94
80225	CHP	0,08530000	R\$ 5,13	R\$ 3,52
TOTAL Equipamento Cuid. Hídrico				R\$ 4,46

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	M3	0,83250000	R\$ 30,06	R\$ 24,97
00001379	KG	213,45100000	R\$ 0,52	R\$ 111,00
00004721	M3	0,55610000	R\$ 80,12	R\$ 44,64
TOTAL Material				R\$ 202,61

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85377	SINAPI	1,31150000	R\$ 23,92	R\$ 31,25
85316	SINAPI	2,10580000	R\$ 20,11	R\$ 42,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 74,20
VALOR:				R\$ 311,27

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00836	CHI	1,00000000	R\$ 311,27	R\$ 311,27
VALOR:				R\$ 311,27

	ORÇÃO	SECRETARIA DO ESTADU MUNICIPAL DE ITABERA DE NOVA RUSSAS - CE. CONDIÇÃO DE CONTRATO DE RESPASSE Nº 9581482024/AMESP/CAVIA E PLANO DE TRABALHO Nº 100810-32.	DATA: 16/12/2024	BRD: 24,55%
	CERTAME	JUV-CPI0037824	SEMPRE	SEMPRE
	DATA DO CERTAME	16/12/2024	SEMPRE	SEMPRE
	LOCAL	NOVA RUSSAS - CE	SEMPRE	SEMPRE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	AREA MEDIA	M2	R\$ 57,90	R\$ 45,05
10260	BRITA	M3	R\$ 69,63	R\$ 67,25
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	R\$ 0,49	R\$ 107,80
TOTAL Material				R\$ 220,10

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	R\$ 116,48	R\$ 184,60
TOTAL Mão de Oba				R\$ 184,60
VALOR:				R\$ 404,70

C0838 CONCRETO PVBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONERA ELÉTRICA 50XL (CHP)	H	R\$ 25,18	R\$ 17,58
TOTAL Equipamento Caba Hoistec				R\$ 17,58

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	AREA MEDIA	M2	R\$ 57,90	R\$ 53,25
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	R\$ 0,49	R\$ 124,46
11605	PEDRISCO	M3	R\$ 59,21	R\$ 59,21
TOTAL Material				R\$ 236,92

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	R\$ 18,48	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Oba				R\$ 110,76
VALOR:				R\$ 347,68

C0840 CONCRETO PVBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONERA ELÉTRICA 50XL (CHP)	H	R\$ 25,18	R\$ 17,58
TOTAL Equipamento Caba Hoistec				R\$ 17,58

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	AREA MEDIA	M2	R\$ 57,90	R\$ 51,37
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	R\$ 0,49	R\$ 144,06
11605	PEDRISCO	M3	R\$ 59,21	R\$ 59,21
TOTAL Material				R\$ 264,64

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	R\$ 18,48	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Oba				R\$ 110,76
VALOR:				R\$ 375,40

C3288 CONCRETO PVBR., FCK-10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF.) (M3)

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	R\$ 12,99	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Oba				R\$ 0,56

	ORÇÃO	SECRETARIA DO ESTADU MUNICIPAL DE ITABERA DE NOVA RUSSAS - CE. CONDIÇÃO DE CONTRATO DE RESPASSE Nº 9581482024/AMESP/CAVIA E PLANO DE TRABALHO Nº 100810-32.	DATA: 16/12/2024	BRD: 24,55%
	CERTAME	JUV-CPI0037824	SEMPRE	SEMPRE
	DATA DO CERTAME	16/12/2024	SEMPRE	SEMPRE
	LOCAL	NOVA RUSSAS - CE	SEMPRE	SEMPRE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONERA COM MOTOR A DIESEL (CH)	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10567	BETONERA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	R\$ 22,61	R\$ 27,37
TOTAL Equipamento Caba Hoistec				R\$ 27,37

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	R\$ 0,49	R\$ 124,46
TOTAL Material				R\$ 124,46

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	R\$ 16,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Oba				R\$ 110,76

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	R\$ 7,74	R\$ 7,12
C3283	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	R\$ 67,61	R\$ 75,24
TOTAL Servico				R\$ 82,36

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CH) (H)

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12761	MÃO DE OBRÀ DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	R\$ 26,81	R\$ 26,81
12701	DEPRECAÇÃO	H	R\$ 1,00	R\$ 211,36
12702	JUROS	H	R\$ 1,00	R\$ 70,45
12703	MANUTENÇÃO	H	R\$ 1,00	R\$ 261,81
TOTAL Oba				R\$ 560,43
VALOR:				R\$ 310,62

10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12761	MÃO DE OBRÀ DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	R\$ 26,81	R\$ 26,81
12701	DEPRECAÇÃO	H	R\$ 1,00	R\$ 211,36
12702	JUROS	H	R\$ 1,00	R\$ 70,45
12703	MANUTENÇÃO	H	R\$ 1,00	R\$ 261,81
TOTAL Oba				R\$ 560,43
VALOR:				R\$ 310,62

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTAS COM ENFERMAGRES) - HORISTA (H)

Item de Oba	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	R\$ 12,99	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Oba				R\$ 0,56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURO DE NOVA RIBES - LULA CONFORME CONTRATO DE REPARO Nº 0001322024
 CERTAME: JUA-CP002024
 DATA DO CERTAME: 19/12/2024
 LOCAL: NOVA RIBESAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RIBESAS - CE

DATA: 06/12/2024

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	0,01500000	H	R\$ 17,81	R\$ 0,30
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,30
VALOR:				R\$ 0,30

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	0,01500000	H	R\$ 17,81	R\$ 0,30
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,30
VALOR:				R\$ 0,30

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	0,01500000	H	R\$ 17,81	R\$ 0,23
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,23
VALOR:				R\$ 0,23

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	0,04207000	H	R\$ 17,81	R\$ 0,76
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,76
VALOR:				R\$ 0,76

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	0,03066000	H	R\$ 17,81	R\$ 0,36
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,36
VALOR:				R\$ 0,36

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	0,03066000	H	R\$ 22,29	R\$ 0,27
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,27
VALOR:				R\$ 0,27

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	0,00957000	H	R\$ 17,82	R\$ 0,16
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,16
VALOR:				R\$ 0,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURO DE NOVA RIBES - LULA CONFORME CONTRATO DE REPARO Nº 0001322024
 CERTAME: JUA-CP002024
 DATA DO CERTAME: 19/12/2024
 LOCAL: NOVA RIBESAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RIBESAS - CE

DATA: 20/12/2024

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	0,01280000	H	R\$ 21,65	R\$ 0,28
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,28
VALOR:				R\$ 0,28

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	0,01280000	H	R\$ 21,65	R\$ 0,28
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,28
VALOR:				R\$ 0,28

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	0,00957000	H	R\$ 19,08	R\$ 0,19
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,19
VALOR:				R\$ 0,19

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	0,02442000	H	R\$ 17,81	R\$ 0,43
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,43
VALOR:				R\$ 0,43

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	0,01699000	H	R\$ 17,81	R\$ 0,30
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,30
VALOR:				R\$ 0,30

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004111	0,02442000	H	R\$ 12,01	R\$ 0,29
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,29
VALOR:				R\$ 0,29

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004220	0,01280000	H	R\$ 21,65	R\$ 0,28
TOTAL Mês de Obra				R\$ 0,28
VALOR:				R\$ 0,28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE. CONFORME CONTRATO DE RESPESSA Nº 981186203A/MEFPC/CA/EA E PLANO DE TRABALHO Nº 1026810-22	DATA	06/12/2024	EDI	24,52%
CERTAME	JAN-27/2024	FORTE	SEINFRA	84,4%	47,4%
DATA DO CERTAME	12/12/2024	SEINFRA	SEINFRA	47,4%	47,4%
LOCAL	NOVA RUISSAS - CE	SEINFRA	SEINFRA	47,4%	47,4%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	SEINFRA	SEINFRA	47,4%	47,4%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02701	DEFRECAÇÃO	SEINFRA	H	1,14720000	RS 1,00	RS 1,15
02702	JUROS	SEINFRA	H	0,21745000	RS 1,00	RS 0,22
02703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,60380000	RS 1,00	RS 0,60
TOTAL Geral						RS 1,97
VALOR:						RS 1,97

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 3,39	RS 3,39
00043484	EPI - FAMÍLIA (HORISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,20	RS 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,34	RS 1,34
00043480	FERRAMENTAS - FAMÍLIA (HORISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,85	RS 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,04	RS 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,10	RS 1,10
TOTAL Encargos Complementares						RS 7,92
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 17,61	RS 17,61
TOTAL Mão de Obra						RS 17,61

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,75	RS 0,75
TOTAL Serviço						RS 0,75
VALOR:						RS 26,26

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 3,39	RS 3,39
00043485	EPI - FAMÍLIA (ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,06	RS 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,34	RS 1,34
00043481	FERRAMENTAS - FAMÍLIA (ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,31	RS 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,04	RS 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,10	RS 1,10
TOTAL Encargos Complementares						RS 7,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


OBRA	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUISSAS - CE. CONFORME CONTRATO DE RESPESSA Nº 981186203A/MEFPC/CA/EA E PLANO DE TRABALHO Nº 1026810-22	DATA	06/12/2024	EDI	24,52%
CERTAME	JAN-27/2024	FORTE	SEINFRA	84,4%	47,4%
DATA DO CERTAME	12/12/2024	SEINFRA	SEINFRA	47,4%	47,4%
LOCAL	NOVA RUISSAS - CE	SEINFRA	SEINFRA	47,4%	47,4%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	SEINFRA	SEINFRA	47,4%	47,4%




Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002596	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 17,61	RS 17,61
TOTAL Mão de Obra						RS 17,61
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,36	RS 0,36
TOTAL Serviço						RS 0,36
VALOR:						RS 26,21

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) (BRANCO) 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	RS 4,19	RS 4,19
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	RS 2,87	RS 0,06
TOTAL Material						RS 4,25
58237	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	RS 25,21	RS 3,84
58316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	RS 20,11	RS 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 4,81
VALOR:						RS 9,06

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10096	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	SEINFRA	H	0,0007510	RS 106,35	RS 0,01
10710	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	RS 256,73	RS 2,13
10666	TRATOR DE ESTEREA CLÁMINA E ESC. HP 145 (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	RS 93,19	RS 0,00
10779	TRATOR DE ESTEREA CLÁMINA E ESC. HP 165 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751860	RS 242,01	RS 1,82
TOTAL Equipamento Cabo Injeção						RS 3,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503729	RS 18,46	RS 0,28
TOTAL Mão de Obra						RS 6,26
VALOR:						RS 4,24

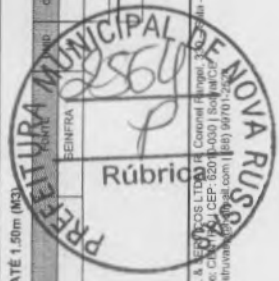Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503729	RS 18,46	RS 0,28
TOTAL Mão de Obra						RS 6,26
VALOR:						RS 4,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA: REFORMA DO SETOR MUNICIPAL DE UTILIDADES DE NOVA RUSSAS - DE CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 8561482025/ME/SP/CAVA E PLANO DE TRABALHO Nº 10888 10.22.	DATA: 09/12/2024
CERTAME: JUN/CP03/2024	ORÇÃO: 19064
VALOR DO CERTAME: 12122024	ORÇÃO COM DESONERÇÃO: 84,41%
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	PROFITA: 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	
	
OBRA: REFORMA DO SETOR MUNICIPAL DE UTILIDADES DE NOVA RUSSAS - DE CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 8561482025/ME/SP/CAVA E PLANO DE TRABALHO Nº 10888 10.22.	DATA: 09/12/2024
CERTAME: JUN/CP03/2024	ORÇÃO: 19064
VALOR DO CERTAME: 12122024	ORÇÃO COM DESONERÇÃO: 84,41%
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	PROFITA: 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	
	
OBRA: REFORMA DO SETOR MUNICIPAL DE UTILIDADES DE NOVA RUSSAS - DE CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 8561482025/ME/SP/CAVA E PLANO DE TRABALHO Nº 10888 10.22.	DATA: 09/12/2024
CERTAME: JUN/CP03/2024	ORÇÃO: 19064
VALOR DO CERTAME: 12122024	ORÇÃO COM DESONERÇÃO: 84,41%
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	PROFITA: 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	
	

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12701	DEPRECIÇÃO	H	SEINFRA	0,181100000	R\$ 1,00	R\$ 0,18
12702	JUROS	H	SEINFRA	0,061100000	R\$ 1,00	R\$ 0,06
12703	MANUTENÇÃO	H	SEINFRA	0,113200000	R\$ 1,00	R\$ 0,11
					TOTAL Geral	R\$ 0,35
					VALOR:	R\$ 0,36


Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10655	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	SEINFRA	0,400000000	R\$ 5,85	R\$ 2,34
11728	PREGO 19x27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	SEINFRA	0,150000000	R\$ 9,84	R\$ 1,48
11845	SARRAFO DE 17x4"	M	SEINFRA	0,500000000	R\$ 4,19	R\$ 2,10
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	SEINFRA	1,000000000	R\$ 8,85	R\$ 8,85
					TOTAL Material	R\$ 14,77
					VALOR:	R\$ 15,11

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	SEINFRA	1,300000000	R\$ 19,10	R\$ 24,83
10486	CARPITEIRO	H	SEINFRA	1,300000000	R\$ 24,18	R\$ 31,41
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 56,24
					VALOR:	R\$ 71,01

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	SEINFRA	1,000000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
12701	DEPRECIÇÃO	H	SEINFRA	9,028600000	R\$ 1,00	R\$ 9,03
12702	JUROS	H	SEINFRA	3,047200000	R\$ 1,00	R\$ 3,05
					TOTAL Geral	R\$ 33,37
					VALOR:	R\$ 33,37

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	SEINFRA	1,000000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	SEINFRA	1,000000000	R\$ 93,42	R\$ 93,42
12701	DEPRECIÇÃO	H	SEINFRA	9,028600000	R\$ 1,00	R\$ 9,03
12702	JUROS	H	SEINFRA	3,047200000	R\$ 1,00	R\$ 3,05
12703	MANUTENÇÃO	H	SEINFRA	7,900000000	R\$ 1,00	R\$ 7,90
					TOTAL Geral	R\$ 134,69

CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sbb - (203 D)
 Bairro: CENTRO | CEP: 62010-000 | Sobral/CE
 construvasp@bolmail.com | (85) 99701-5254


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA: REFORMA DO SETOR MUNICIPAL DE UTILIDADES DE NOVA RUSSAS - DE CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 8561482025/ME/SP/CAVA E PLANO DE TRABALHO Nº 10888 10.22.	DATA: 09/12/2024
CERTAME: JUN/CP03/2024	ORÇÃO: 19064
VALOR DO CERTAME: 12122024	ORÇÃO COM DESONERÇÃO: 84,41%
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	PROFITA: 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	
	
OBRA: REFORMA DO SETOR MUNICIPAL DE UTILIDADES DE NOVA RUSSAS - DE CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 8561482025/ME/SP/CAVA E PLANO DE TRABALHO Nº 10888 10.22.	DATA: 09/12/2024
CERTAME: JUN/CP03/2024	ORÇÃO: 19064
VALOR DO CERTAME: 12122024	ORÇÃO COM DESONERÇÃO: 84,41%
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	PROFITA: 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	
	

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)	H	SINAPI	1,000000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,000000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	1,000000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,000000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	1,000000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 7,83
					VALOR:	R\$ 134,69

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
85694	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	SINAPI	1,000000000	R\$ 66,69	R\$ 66,69
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA BANTARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	SINAPI	2,000000000	R\$ 12,39	R\$ 24,78
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	SINAPI	0,009400000	R\$ 95,96	R\$ 2,92
					TOTAL Material	R\$ 94,37
					VALOR:	R\$ 20,39

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,387000000	R\$ 25,21	R\$ 9,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,188000000	R\$ 20,11	R\$ 3,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 13,55
					VALOR:	R\$ 109,92

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BETELET.800L (H)	H	SEINFRA	1,000000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
02548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	SEINFRA	1,000000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
					TOTAL	R\$ 42,58
					VALOR:	R\$ 109,92

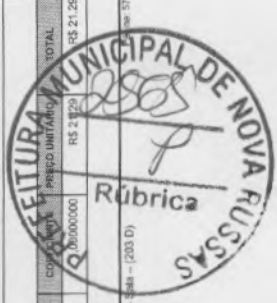

CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sbb - (203 D)
 Bairro: CENTRO | CEP: 62010-000 | Sobral/CE
 construvasp@bolmail.com | (85) 99701-5254

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 999-1492024/MS/SP/CA/MA E PLANO DE TRABALHO Nº 1036810-22
 CERTAME: JUN-CR003/2024
 DATA DO CERTAME: 12/12/2024
 LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

DATA: 12/12/2024
 FORTI: 081100013000000000
 UNID: H
 COEFICIENTE: 1,000000000
 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 21,29
 TOTAL: R\$ 21,29

VALOR: R\$ 21,29

TOTAL MÃO DE OBR.	R\$ 21,29
VALOR:	R\$ 21,29

12716 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. MOTOR DIESEL (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
TOTAL MÃO DE OBR.					R\$ 21,29
VALOR:					R\$ 21,29

C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. PIPÁRA-RAIO H=3M, D=48 OU 50MM (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10226	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2"	UN	1,000000000	R\$ 39,20	R\$ 39,20
10341	CABO COBRE Nº 7/0MM2	M	3,000000000	R\$ 45,50	R\$ 136,50
10650	CONJUNTO DE ESTANAMEN TO PARA PARA-RAIOS	UN	1,000000000	R\$ 77,20	R\$ 77,20
110254	MASTRO SIMPLES F5 DE 1 1/2"X3M	UN	1,000000000	R\$ 105,92	R\$ 105,92
11888	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	UN	3,000000000	R\$ 12,20	R\$ 36,60
TOTAL MATERIAL					R\$ 365,19

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8,000000000	R\$ 19,10	R\$ 152,80
03312	ELETRICISTA	H	8,000000000	R\$ 24,15	R\$ 193,20
TOTAL MÃO DE OBR.					R\$ 346,00
VALOR:					R\$ 741,19

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	L	1,125000000	R\$ 3,46	R\$ 3,89
TOTAL MATERIAL					R\$ 3,89
VALOR:					R\$ 3,89

12747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVERIO (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12707	GASOLINA	L	9,720000000	R\$ 3,52	R\$ 34,21
TOTAL MATERIAL					R\$ 34,21
VALOR:					R\$ 34,21

12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	L	16,650000000	R\$ 3,46	R\$ 57,61
TOTAL MATERIAL					R\$ 57,61
VALOR:					R\$ 57,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 999-1492024/MS/SP/CA/MA E PLANO DE TRABALHO Nº 1036810-22
 CERTAME: JUN-CR003/2024
 DATA DO CERTAME: 12/12/2024
 LOCAL: NOVA RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

DATA: 12/12/2024
 FORTI: 081100013000000000
 UNID: L
 COEFICIENTE: 27,000000000
 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 93,42
 TOTAL: R\$ 93,42

VALOR: R\$ 93,42

TOTAL MATERIAL	R\$ 93,42
VALOR:	R\$ 93,42

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	L	27,000000000	R\$ 3,46	R\$ 93,42
TOTAL MATERIAL					R\$ 93,42
VALOR:					R\$ 93,42

12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	L	13,600000000	R\$ 47,06	R\$ 640,82
TOTAL MATERIAL					R\$ 640,82
VALOR:					R\$ 640,82

12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	L	1,050000000	R\$ 3,46	R\$ 3,63
TOTAL MATERIAL					R\$ 3,63
VALOR:					R\$ 3,63

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	L	14,100000000	R\$ 3,46	R\$ 48,79
TOTAL MATERIAL					R\$ 48,79
VALOR:					R\$ 48,79

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	L	27,000000000	R\$ 3,46	R\$ 93,42
TOTAL MATERIAL					R\$ 93,42
VALOR:					R\$ 93,42

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	L	23,250000000	R\$ 3,46	R\$ 80,45
TOTAL MATERIAL					R\$ 80,45
VALOR:					R\$ 80,45

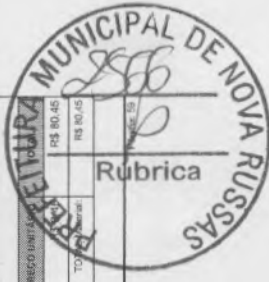

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTERIL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 009/10-22. DATA: 08/12/2024. BDI: 24,52%.

CERTAME: JUAJ-CR003/2024. DATA DO CERTAME: 12/12/2024. VALOR: R\$ 80,45.

LOCAL: NOVA RUSSAS - CE. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE.

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 0,79
SEINFRA	H	0,18670000	R\$ 0,20
SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 0,41
TOTAL Mão de Obra			R\$ 1,40
VALOR:			R\$ 1,40

10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 0,79
SEINFRA	H	0,18670000	R\$ 0,20
SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 0,41
TOTAL Mão de Obra			R\$ 1,40
VALOR:			R\$ 1,40

12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVERO (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	18,83	R\$ 18,83
TOTAL Mão de Obra			R\$ 18,83
VALOR:			R\$ 18,83

12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	28,81	R\$ 28,81
TOTAL Mão de Obra			R\$ 28,81
VALOR:			R\$ 28,81

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	28,81	R\$ 28,81
TOTAL Mão de Obra			R\$ 28,81
VALOR:			R\$ 28,81

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	21,29	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra			R\$ 21,29
VALOR:			R\$ 21,29

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	24,51	R\$ 24,51
TOTAL Mão de Obra			R\$ 24,51
VALOR:			R\$ 24,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTERIL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 009/10-22. DATA: 08/12/2024. BDI: 24,52%.

CERTAME: JUAJ-CR003/2024. DATA DO CERTAME: 12/12/2024. VALOR: R\$ 245,1.

LOCAL: NOVA RUSSAS - CE. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE.

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 21,29
VALOR:			R\$ 21,29

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 21,29
VALOR:			R\$ 21,29

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 21,29
VALOR:			R\$ 21,29

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 28,81
VALOR:			R\$ 28,81

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 21,29
VALOR:			R\$ 21,29

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 28,81
VALOR:			R\$ 28,81

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 28,81
VALOR:			R\$ 28,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149203AMESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 12036 (0-22)	DATA: 12/12/2024
CERTAME: JUA-CP0037024	FORTE: 00000000
DATA DO CERTAME: 12/12/2024	TIPO DE FORTE: 00000000
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	UNID: H
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,01
	COEFICIENTE: 1,00000000
	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,01
	TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,01
	TOTAL Encargos Complementares: R\$ 0,04
	TOTAL: R\$ 0,05

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037372	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
			TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,14
			TOTAL:	R\$ 17,02

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037660	H	1,00000000	R\$ 17,02	R\$ 17,02
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,02

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96389	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
			TOTAL Serviço:	R\$ 0,16
			VALOR:	R\$ 23,92

Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
			TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,74
			VALOR:	R\$ 29,67

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004230	H	1,00000000	R\$ 21,65	R\$ 21,65
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,65

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96386	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
			TOTAL Serviço:	R\$ 0,28
			VALOR:	R\$ 26,67

Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
			TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,39

CONSTRUASBP CONST. & SERVIÇOS LTDA I R. Coronel Rangel, 330 - Saa - (203 D).
Bairro: CENTRO | CEP: 60016-000 | Nova Russas - CE
cont@novaru.com | (85) 99101-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149203AMESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 12036 (0-22)	DATA: 12/12/2024
CERTAME: JUA-CP0037024	FORTE: 00000000
DATA DO CERTAME: 12/12/2024	TIPO DE FORTE: 00000000
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	UNID: H
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,86
	COEFICIENTE: 1,00000000
	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,86
	TOTAL Mão de Obra: R\$ 19,86
	TOTAL Encargos Complementares: R\$ 8,74
	TOTAL: R\$ 28,61

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
			TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,74
			TOTAL:	R\$ 19,86

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004248	H	1,00000000	R\$ 19,86	R\$ 19,86
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,86

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96364	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
			TOTAL Serviço:	R\$ 0,19
			VALOR:	R\$ 26,91

Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00330	UN	1,00000000	R\$ 54,04	R\$ 54,04
			TOTAL Material:	R\$ 54,04
			TOTAL:	R\$ 14,94

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042	H	1,50000000	R\$ 19,10	R\$ 28,65
02312	H	1,50000000	R\$ 24,15	R\$ 36,23
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 64,88
			VALOR:	R\$ 128,92

Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	H	1,00000000	R\$ 0,62	R\$ 0,62
00037373	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
			TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,74
			TOTAL:	R\$ 73,91

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	H	1,00000000	R\$ 1,51	R\$ 1,51
			TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,51

Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	H	1,00000000	R\$ 1,51	R\$ 1,51
			TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,51

CONSTRUASBP CONST. & SERVIÇOS LTDA I R. Coronel Rangel, 330 - Saa - (203 D).
Bairro: CENTRO | CEP: 60016-000 | Nova Russas - CE
cont@novaru.com | (85) 99101-2524



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA: REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE ITUIBA DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 899-145202-ANESPEC/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 10926 19-22	DATA: 09/12/2024
CERTAME: JUV-CP00302024	REBATE: 84,4%
DATA DO CERTAME: 12/12/2024	REBATE COM DESCONTO: 80,3%
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	REBATE COM DESCONTO E INCENTIVO FISCAL: 60,0%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	REBATE COM INCENTIVO FISCAL: 5,0%
CONSTRUVASP CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D) Bairro CENTRO, CEP: 62010-030) SOFISCEL construvasp@outlook.com (88) 99701-2524	

Serviço: 16371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	UNID: H	QUANT: 1	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,43	TOTAL: R\$ 0,43
				COEFICIENTE: 1,00000000	TOTAL MÍN DE OBRAS: R\$ 17,61
				VALOR: R\$ 25,97	TOTAL SERVIÇO: R\$ 0,43

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)					
Quant	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12823	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29	
12701	H	2,50900000	R\$ 1,00	R\$ 2,51	
12702	H	0,47800000	R\$ 1,00	R\$ 0,47	
				TOTAL Geral: R\$ 34,27	VALOR: R\$ 24,21

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)					
Quant	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12823	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29	
12701	H	2,50900000	R\$ 1,00	R\$ 2,51	
12702	H	0,47800000	R\$ 1,00	R\$ 0,47	
12703	H	1,39270000	R\$ 1,00	R\$ 1,39	
				TOTAL Geral: R\$ 26,61	VALOR: R\$ 25,61

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Quant	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39	
00043480	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73	
00037372	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34	
00043486	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97	
00037373	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
00037371	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10	
				TOTAL Encargos Complementares: R\$ 9,57	
Quant	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61	
				TOTAL MÍN DE OBRAS: R\$ 17,61	VALOR: R\$ 17,61

Serviço: 16371	PINTOR (HORISTA)	UNID: H	QUANT: 1	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 17,61	TOTAL: R\$ 17,61
				VALOR: R\$ 25,97	TOTAL SERVIÇO: R\$ 17,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA: REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE ITUIBA DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 899-145202-ANESPEC/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 10926 19-22	DATA: 09/12/2024
CERTAME: JUV-CP00302024	REBATE: 84,4%
DATA DO CERTAME: 12/12/2024	REBATE COM DESCONTO: 80,3%
LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	REBATE COM DESCONTO E INCENTIVO FISCAL: 60,0%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	REBATE COM INCENTIVO FISCAL: 5,0%
CONSTRUVASP CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D) Bairro CENTRO, CEP: 62010-030) SOFISCEL construvasp@outlook.com (88) 99701-2524	

Serviço: 95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	UNID: H	QUANT: 1	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,29	TOTAL: R\$ 0,29
				COEFICIENTE: 1,00000000	TOTAL SERVIÇO: R\$ 0,29
				VALOR: R\$ 27,47	TOTAL MATERIAL: R\$ 6,99

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021 (M2)					
Quant	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007340	L	0,32570000	R\$ 21,45	R\$ 6,99	
				TOTAL MATERIAL: R\$ 6,99	
Quant	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	H	0,45200000	R\$ 27,47	R\$ 12,41	
				TOTAL MÍN DE OBRAS COM INCENTIVO FISCAL COMPLETARE: R\$ 12,41	VALOR: R\$ 19,43

181618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020 (M3)					
Quant	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91534	CHI	0,06660000	R\$ 29,71	R\$ 1,98	
91533	CHP	0,07100000	R\$ 35,15	R\$ 2,52	
				TOTAL Equipamento Cade Hidraulico: R\$ 4,50	
Quant	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	M3	1,10000000	R\$ 90,08	R\$ 99,07	
				TOTAL MATERIAL: R\$ 99,07	

Mão de Obra com Incargos Complementares					
Quant	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	H	2,02180000	R\$ 25,97	R\$ 52,51	
88316	H	3,03290000	R\$ 20,11	R\$ 60,99	
				TOTAL MÍN DE OBRAS COM INCENTIVO FISCAL COMPLETARE: R\$ 113,50	VALOR: R\$ 217,07

C2066 PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3,00M (UN)					
Quant	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11904	UN	2,00000000	R\$ 6,10	R\$ 12,20	
12715	UN	1,00000000	R\$ 87,77	R\$ 87,77	
				TOTAL MATERIAL: R\$ 99,97	

Mão de Obra	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	1,50000000	R\$ 28,05	R\$ 42,08
12312	H	1,50000000	R\$ 24,15	R\$ 36,23
				TOTAL MÍN DE OBRAS COM INCENTIVO FISCAL COMPLETARE: R\$ 78,31



CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D) Bairro CENTRO, CEP: 62010-030) SOFISCEL construvasp@outlook.com | (88) 99701-2524

CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D) Bairro CENTRO, CEP: 62010-030) SOFISCEL construvasp@outlook.com | (88) 99701-2524

Página 54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0001/10-22.	DATA:	30/12/2024	DEI:	24,52%
CERTAME:	JUR/C00030204	ORÇAMENTO:	1000000000	RECURSOS:	MEI
DATA DO CERTAME:	12/12/2024	RECURSOS:	2000000000	RECURSOS:	MEI
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	RECURSOS:	2000000000	RECURSOS:	MEI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE				

TOTAL Mto de Oros	RS 64,88
VALOR:	RS 164,85

Equipamento	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88128 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)	UN	1,00000000	RS 25,91	RS 25,91
TOTAL Mto de Oros com Encargos Complementares				RS 26,91

Equipamento	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88128 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)	UN	1,00000000	RS 41,30	RS 41,30
TOTAL Mto de Oros com Encargos Complementares				RS 10,51
TOTAL Serviço:				RS 52,21
VALOR:				RS 75,12

Equipamento	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88128 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	UN	1,00000000	RS 41,30	RS 41,30
88128 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUIROS. AF_06/2014	UN	1,00000000	RS 10,51	RS 10,51
53857 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	UN	1,00000000	RS 73,75	RS 73,75
53858 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	UN	1,00000000	RS 32,85	RS 32,85
TOTAL Serviço:				RS 158,81
VALOR:				RS 185,72

Equipamento	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88128 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)	UN	0,00005600	RS 737.500,00	RS 41,30
TOTAL Equipamento:				RS 41,30
VALOR:				RS 41,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0001/10-22.	DATA:	30/12/2024	DEI:	24,52%
CERTAME:	JUR/C00030204	ORÇAMENTO:	1000000000	RECURSOS:	MEI
DATA DO CERTAME:	12/12/2024	RECURSOS:	2000000000	RECURSOS:	MEI
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	RECURSOS:	2000000000	RECURSOS:	MEI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE				

TOTAL Mto de Oros	RS 10,52
VALOR:	RS 10,91

Equipamento	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88128 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUIROS. AF_06/2014 (H)	UN	0,00001480	RS 737.500,00	RS 10,92
TOTAL Equipamento:				RS 10,92
VALOR:				RS 10,91

Equipamento	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
53857 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)	UN	0,00010000	RS 737.500,00	RS 73,75
TOTAL Equipamento:				RS 73,75
VALOR:				RS 73,75

Equipamento	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
53858 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)	L	7,64000000	RS 5,30	RS 32,85
TOTAL Material:				RS 32,85
VALOR:				RS 32,85

Equipamento	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C12123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PADEME (M2)	M3	0,00610000	RS 57,90	RS 0,35
0105 AREIA MEDIA	KG	1,22000000	RS 0,67	RS 0,82
0441 CAL HIDRATADA	KG	1,22000000	RS 0,67	RS 0,82
TOTAL Material:				RS 1,17
VALOR:				RS 1,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA		REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUBRÃO DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 89918522012MERCADAM E PLANO DE TRABALHO Nº 120818-12-2	BOI 24,52%	BRF 10,00%
CERTAME	DATA DO CERTAME LOCAL	15/12/2024	84,4%	47,8%
CLIENTE	NOVA RUSSAS - CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	84,4%	47,8%

OBRA	REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUBRÃO DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 89918522012MERCADAM E PLANO DE TRABALHO Nº 120818-12-2	BOI 24,52%	BRF 10,00%	
CERTAME	DATA DO CERTAME LOCAL	15/12/2024	84,4%	47,8%
CLIENTE	NOVA RUSSAS - CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	84,4%	47,8%

Material	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
10660 CORDÃO DE TONANTE	M	1,24000000	R\$ 4,16	R\$ 5,16
12407 DINAMITE 60%	KG	0,06000000	R\$ 12,00	R\$ 0,85
12568 DINAMITE GRANULADA	KG	0,54000000	R\$ 11,13	R\$ 6,01
12326 ESPOLETA	UN	0,00000000	R\$ 5,13	R\$ 0,05
12329 ESTOFIM	M	0,06000000	R\$ 5,02	R\$ 0,30
12535 SÉRIE DE BROCHAS E 12 D=22MM	JG	0,00050000	R\$ 505,10	R\$ 0,25
TOTAL Material				R\$ 12,42

Material	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
8221 BLASTER	H	0,05882353	R\$ 23,93	R\$ 1,41
8243 SERVENTE	H	0,58823529	R\$ 18,46	R\$ 10,86
TOTAL Mão de Obra				R\$ 12,27
VALOR:				R\$ 35,89

Material	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043481 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043487 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373 SELADO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares				R\$ 7,81
TOTAL				R\$ 12,01
TOTAL Mão de Obra				R\$ 12,01

Material	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço				R\$ 0,29
VALOR:				R\$ 20,11

Material	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
00003146 FITA VEDA RUSSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02100000	R\$ 2,67	R\$ 0,09
00046945 SELADO - TUBO SIFONADO EXTENSIVEL(SANFONADO UNIPRESSÃO) SIMPLES, ENTRE 50 A 70" CM, DE PLÁSTICO BRANCO	UN	1,00000000	R\$ 6,93	R\$ 6,93
TOTAL				R\$ 7,02

CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 336 - Sala - (203 D) | Bairro: CENTRO | CEP: 62010-000 | Sobral-CE | construvasp@bol.com.br | (85) 99701-2524

CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 336 - Sala - (203 D) | Bairro: CENTRO | CEP: 62010-000 | Sobral-CE | construvasp@bol.com.br | (85) 99701-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA		REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUBRÃO DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 89918522012MERCADAM E PLANO DE TRABALHO Nº 120818-12-2	BOI 24,52%	BRF 10,00%
CERTAME	DATA DO CERTAME LOCAL	15/12/2024	84,4%	47,8%
CLIENTE	NOVA RUSSAS - CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	84,4%	47,8%

OBRA	REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUBRÃO DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 89918522012MERCADAM E PLANO DE TRABALHO Nº 120818-12-2	BOI 24,52%	BRF 10,00%	
CERTAME	DATA DO CERTAME LOCAL	15/12/2024	84,4%	47,8%
CLIENTE	NOVA RUSSAS - CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	84,4%	47,8%

Material	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
88207 ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08450000	R\$ 25,21	R\$ 2,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02860000	R\$ 20,11	R\$ 0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 2,66
VALOR:				R\$ 9,48

Material	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
00003146 FITA VEDA RUSSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02100000	R\$ 2,67	R\$ 0,06
00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, MONTAGEM CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1193)	UN	1,00000000	R\$ 49,19	R\$ 49,19
TOTAL Material				R\$ 49,25

Material	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
88207 ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08450000	R\$ 25,21	R\$ 2,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03030000	R\$ 20,11	R\$ 0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 3,03
VALOR:				R\$ 52,28

Material	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
02942 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,00000000	R\$ 28,81	R\$ 28,81
87911 DEPRECIÇÃO	H	45,58990000	R\$ 1,00	R\$ 45,58
82702 JUROS	H	18,80210000	R\$ 1,00	R\$ 18,80
TOTAL Obra				R\$ 93,19
VALOR:				R\$ 93,19

Material	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
02942 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,00000000	R\$ 28,81	R\$ 28,81
82841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,00000000	R\$ 80,45	R\$ 80,45
82701 DEPRECIÇÃO	H	45,59090000	R\$ 1,00	R\$ 45,59
82702 JUROS	H	18,80210000	R\$ 1,00	R\$ 18,80
82703 MANUTENÇÃO	H	88,37140000	R\$ 1,00	R\$ 88,37
TOTAL Obra				R\$ 242,01
VALOR:				R\$ 242,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇÃO	REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FÉTERO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 8911822024INSPICAJA E PLANO DE TRABALHO Nº 1569515-2.	DATA:	06/12/2024	BDI: 24,52%
CERTAME	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1" SEM UNHO E SEM LADRÃO	EMPRESA	CONSTRUVA SP	MPR: 47,46%
DATA DO CERTAME	12/19/2024	EMPRESA	CONSTRUVA SP	MPR: 47,46%
LOCAL	NOVA RUSSAS - CE	EMPRESA	CONSTRUVA SP	MPR: 47,46%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	EMPRESA	CONSTRUVA SP	MPR: 47,46%

QUANTIDADE	UNIDADE	FORNECEDOR	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	UN	SINAPI	R\$ 2,87	R\$ 0,09
00009153	UN	SINAPI	R\$ 4,07	R\$ 0,07
TOTAL Material				R\$ 4,16

QUANTIDADE	UNIDADE	FORNECEDOR	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80267	H	SINAPI	R\$ 25,21	R\$ 3,11
80316	H	SINAPI	R\$ 20,11	R\$ 0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 3,89
VALOR:				R\$ 8,05

CONSTRUVA SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FÉTERO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 8911822024INSPICAJA E PLANO DE TRABALHO Nº 1569515-2.

CERTAME: 06/12/2024

EMPRESA: CONSTRUVA SP

LOCAL: NOVA RUSSAS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

ITEM	INDICAÇÃO	VALOR INICIAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	Temp. Paralela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 20.951,10	R\$ 3.602,61	R\$ 4.076,67	R\$ 3.819,85	R\$ 3.582,22	R\$ 3.344,59	R\$ 3.106,96	R\$ 2.869,33	R\$ 2.631,70	R\$ 2.394,07	R\$ 2.156,44	R\$ 1.918,81	R\$ 1.681,18	R\$ 20.951,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.000,00	R\$ 2.079,86	R\$ 3.164,79	R\$ 3.259,76	R\$ 3.354,73	R\$ 3.449,70	R\$ 3.544,67	R\$ 3.639,64	R\$ 3.734,61	R\$ 3.829,58	R\$ 3.924,55	R\$ 4.019,52	R\$ 4.114,49	R\$ 25.000,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.100,94	R\$ 258,37	R\$ 407,39	R\$ 556,41	R\$ 705,43	R\$ 854,45	R\$ 1.003,47	R\$ 1.152,49	R\$ 1.301,51	R\$ 1.450,53	R\$ 1.599,55	R\$ 1.748,57	R\$ 1.897,59	R\$ 3.100,94
4	PAREDES E PAREDES	R\$ 7.872,26	R\$ 815,64	R\$ 1.223,46	R\$ 1.631,28	R\$ 2.039,10	R\$ 2.446,92	R\$ 2.854,74	R\$ 3.262,56	R\$ 3.670,38	R\$ 4.078,20	R\$ 4.486,02	R\$ 4.893,84	R\$ 5.301,66	R\$ 7.872,26
5	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 16.365,30	R\$ 1.636,53	R\$ 2.044,35	R\$ 2.452,17	R\$ 2.859,99	R\$ 3.267,81	R\$ 3.675,63	R\$ 4.083,45	R\$ 4.491,27	R\$ 4.899,09	R\$ 5.306,91	R\$ 5.714,73	R\$ 6.122,55	R\$ 16.365,30
6	ESCALONAS E TERRAPLENOS	R\$ 36.962,79	R\$ 3.081,07	R\$ 4.621,61	R\$ 6.162,15	R\$ 7.702,69	R\$ 9.243,23	R\$ 10.783,77	R\$ 12.324,31	R\$ 13.864,85	R\$ 15.405,39	R\$ 16.945,93	R\$ 18.486,47	R\$ 20.027,01	R\$ 36.962,79
7	COBERTURA	R\$ 11.220,42	R\$ 1.122,04	R\$ 1.783,06	R\$ 2.444,08	R\$ 3.105,10	R\$ 3.766,12	R\$ 4.427,14	R\$ 5.088,16	R\$ 5.749,18	R\$ 6.410,20	R\$ 7.071,22	R\$ 7.732,24	R\$ 8.393,26	R\$ 11.220,42
8	REVESTIMENTOS	R\$ 39.078,45	R\$ 3.907,84	R\$ 5.861,76	R\$ 7.815,68	R\$ 9.769,60	R\$ 11.723,52	R\$ 13.677,44	R\$ 15.631,36	R\$ 17.585,28	R\$ 19.539,20	R\$ 21.493,12	R\$ 23.447,04	R\$ 25.400,96	R\$ 39.078,45
9	PROÇAS	R\$ 50.697,32	R\$ 5.069,73	R\$ 7.604,60	R\$ 10.139,47	R\$ 12.674,34	R\$ 15.209,21	R\$ 17.744,08	R\$ 20.278,95	R\$ 22.813,82	R\$ 25.348,69	R\$ 27.883,56	R\$ 30.418,43	R\$ 32.953,30	R\$ 50.697,32
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.840,16	R\$ 1.684,02	R\$ 2.526,03	R\$ 3.368,04	R\$ 4.210,05	R\$ 5.052,06	R\$ 5.894,07	R\$ 6.736,08	R\$ 7.578,09	R\$ 8.420,10	R\$ 9.262,11	R\$ 10.104,12	R\$ 10.946,13	R\$ 16.840,16
11	MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO	R\$ 3.296,00	R\$ 331,11	R\$ 506,67	R\$ 682,23	R\$ 857,79	R\$ 1.033,35	R\$ 1.208,91	R\$ 1.384,47	R\$ 1.559,03	R\$ 1.734,59	R\$ 1.910,15	R\$ 2.085,71	R\$ 2.261,27	R\$ 3.296,00
12	ORÇAMENTO PLUVIAL	R\$ 7.599,62	R\$ 759,96	R\$ 1.139,94	R\$ 1.519,92	R\$ 1.899,90	R\$ 2.279,88	R\$ 2.659,86	R\$ 3.039,84	R\$ 3.419,82	R\$ 3.799,80	R\$ 4.179,78	R\$ 4.559,76	R\$ 4.939,74	R\$ 7.599,62
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 182.776,16	R\$ 18.277,62	R\$ 27.416,43	R\$ 36.555,24	R\$ 45.694,05	R\$ 54.832,86	R\$ 63.971,67	R\$ 73.110,48	R\$ 82.249,29	R\$ 91.388,10	R\$ 100.526,91	R\$ 109.665,72	R\$ 118.804,53	R\$ 182.776,16
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.852,10	R\$ 1.285,21	R\$ 1.927,82	R\$ 2.570,43	R\$ 3.213,04	R\$ 3.855,65	R\$ 4.498,26	R\$ 5.140,87	R\$ 5.783,48	R\$ 6.426,09	R\$ 7.068,70	R\$ 7.711,31	R\$ 8.353,92	R\$ 12.852,10
15	PRINTURIA	R\$ 78.865,89	R\$ 7.886,59	R\$ 11.829,89	R\$ 15.773,19	R\$ 19.716,49	R\$ 23.659,79	R\$ 27.603,09	R\$ 31.546,29	R\$ 35.489,49	R\$ 39.432,69	R\$ 43.375,89	R\$ 47.319,09	R\$ 51.262,29	R\$ 78.865,89

CONSTRUVA SP CONSTR. & SERVIÇOS LTDA. R. Coronel Rangel, 330 - S/N - (203 D) Beirito - CENTRO | CEP: 62010-000 | Sobral/CE construvasp@outlook.com | (88) 99701-2524



Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA-0493. Data: 2024.12.10 14:57:43 -03'00'


VANESSA ARAUJO DE SOUZA-0493

73-49376 / 1457-43-03W

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO-62406094391

CONSTRUVA SP CONSTR. & SERVIÇOS LTDA. R. Coronel Rangel, 330 - S/N - (203 D) Beirito - CENTRO | CEP: 62010-000 | Sobral/CE construvasp@outlook.com | (88) 99701-2524

Figura 72



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA	REFORMA DO ESTABELECIMENTO DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE	DATA: 09/12/2024	BDI: 24,52%
CERTAME	559.146/2024 (ME/EPCC/AV. E PLANO DE TRABALHO N.º 10936/10.32)	FEHRE	10/2024
DATA DO LOCAL	JUN-C/2023/2024	VALOR	R\$ 47.148,00
CLIENTE	NOVA RUSSAS - CE	VALOR COM DESONERAÇÃO	R\$ 47.148,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	VALOR COM DESONERAÇÃO	R\$ 47.148,00

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA	REFORMA DO ESTABELECIMENTO DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE	DATA: 09/12/2024	BDI: 24,52%
CERTAME	559.146/2024 (ME/EPCC/AV. E PLANO DE TRABALHO N.º 10936/10.32)	FEHRE	10/2024
DATA DO LOCAL	JUN-C/2023/2024	VALOR	R\$ 47.148,00
CLIENTE	NOVA RUSSAS - CE	VALOR COM DESONERAÇÃO	R\$ 47.148,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	VALOR COM DESONERAÇÃO	R\$ 47.148,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOT. (R\$)	TOT. (%)
16	SERVICOS FISCAIS	48.722,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.722,00	100,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Atividade de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA-04937349-9376
 Data: 2024.12.10 14:58:09
 143822-03107

Atividade de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE-04937349-9376
 Data: 2024.12.10 14:58:09
 143822-03107

CONSTRUVASP CONSTR. & SERVIÇOS LTDA E. C. Comercial Registr. 330 - Sula - (203 D)
 Rua: Avenida Brasil, 1000 - J. P. de Azevedo - Fortaleza - CE
 construvasp@construv.com | (85) 3471-2524

Página 15

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%
Impostos		
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISS		2,00%
CPFB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)		4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 24,52%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1$$

(1 - I)

Atividade de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA-04937349-9376
 Data: 2024.12.10 14:58:09
 143822-03107

Atividade de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE-04937349-9376
 Data: 2024.12.10 14:58:09
 143822-03107

CONSTRUVASP CONSTR. & SERVIÇOS LTDA E. C. Comercial Registr. 330 - Sula - (203 D)
 Rua: Avenida Brasil, 1000 - J. P. de Azevedo - Fortaleza - CE
 construvasp@construv.com | (85) 3471-2524

Página 16



Atividade de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE-04937349-9376
 Data: 2024.12.10 14:58:09
 143822-03107

Atividade de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA-04937349-9376
 Data: 2024.12.10 14:58:09
 143822-03107

Página 17

ConstruVasp CONSULTORIA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA - CE - EMPANALAMENTO DE REPARAÇÃO N° 1030810-22	DATA: 16/12/2024	RECEITA	158,44%	INSS	0,00%	RF	24,55%
CERTAME	JAN-CP0902024	RECEITA	158,44%	INSS	1,50%	RF	47,48%	
DATA DO CERTAME	12/12/2024	RECEITA	158,44%	INSS	1,00%	RF	47,48%	
LOCAL	NOVA RUSSAS - CE	RECEITA	158,44%	INSS	0,20%	RF	47,48%	
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	RECEITA	158,44%	INSS	2,50%	RF	47,48%	
		RECEITA	158,44%	INSS	3,00%	RF	47,48%	
		RECEITA	158,44%	INSS	8,00%	RF	47,48%	
		RECEITA	158,44%	INSS	0,00%	RF	47,48%	
		RECEITA	158,44%	INSS	16,80%	RF	47,48%	

ConstruVasp CONSULTORIA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA - CE - EMPANALAMENTO DE REPARAÇÃO N° 1030810-22	DATA: 16/12/2024	RECEITA	158,44%	INSS	0,00%	RF	24,55%
CERTAME	JAN-CP0902024	RECEITA	158,44%	INSS	1,50%	RF	47,48%	
DATA DO CERTAME	12/12/2024	RECEITA	158,44%	INSS	1,00%	RF	47,48%	
LOCAL	NOVA RUSSAS - CE	RECEITA	158,44%	INSS	0,20%	RF	47,48%	
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	RECEITA	158,44%	INSS	2,50%	RF	47,48%	
		RECEITA	158,44%	INSS	3,00%	RF	47,48%	
		RECEITA	158,44%	INSS	8,00%	RF	47,48%	
		RECEITA	158,44%	INSS	0,00%	RF	47,48%	
		RECEITA	158,44%	INSS	16,80%	RF	47,48%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B GRUPO B			
B1	Reposou Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriatos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,86%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvva	1,68%	0,08%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,94%	0,93%
	TOTAL	49,89%	19,88%

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B GRUPO B			
B1	Reposou Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriatos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,86%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvva	1,59%	0,09%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,94%	0,93%
	TOTAL	49,36%	19,04%

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



VANESSA ARAUJO DE SOUZA-04937349376
 Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA-04937349376
 Dados: 2024.12.10 14:58:02 -0300

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO-62406094391
 Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO-62406094391
 Dados: 2024.12.10 14:59:11

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO-62406094391
 Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO-62406094391
 Dados: 2024.12.10 14:59:11



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462218
 Proposta: 4955627
 Controle Interno (Código Controle): 609926136
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462218



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP003/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20241105/0001-26.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462218
 Proposta: 4955627
 Controle Interno (Código Controle): 609926136
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462218

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP nº 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim de todos seus Endossos.



APÓLICE DIGITAL



N° Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462218
 Proposta: 4955627
 Controle Interno (Código Controle): 609926136
 N° de Registro SUSEP: 054362024001107750462218



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
 3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVACÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4, importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo lícitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
 a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo lícitado;
 d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
 5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.



N° Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462218
 Proposta: 4955627
 Controle Interno (Código Controle): 609926136
 N° de Registro SUSEP: 054362024001107750462218



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.


5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
 6.1.1. O cálculo da indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.
 6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
 6.2. **Caso o pagamento da indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**
 6.3. O pagamento da indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.
 6.3.1. O não pagamento da indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.
 6.4. Paga a indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
 6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
 I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
 II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;
 III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
 IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;
 V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
 VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;






Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462218
 Proposta: 4955627
 Controle Interno (Código Controle): 609926136
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462218



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462218
 Proposta: 4955627
 Controle Interno (Código Controle): 609926136
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462218



VII. Ausência ou intempetividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
 VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extingui-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- o pagamento da indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:


I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas por terceiros.





N° Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462218
 Proposta: 4955627
 Controle Interno (Código Controle): 609926136
 N° de Registro SUSEP: 054362024001107750462218

- V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.
- XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
- XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
 COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo

https://www2.susep.gov.br/validar-numeracao/validacao_certidaoadm_2017.asp?validar_codigo=54336&codigo=609926136



APÓLICE DIGITAL

08/10/2024, 14:20

Certidão de Administradores de Seguro

08/10/2024, 14:20 SUSP - Superintendência de Seguros Privados

Certidão de Administradores de Seguro

Avaliar o Serviço

DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente



Código da Certidão: CA05436_09122024_134534_528

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2024

https://www2.susp.gov.br/aba/municipal/bf0b0e5c5e1e_certidoesusp_2011_1447/fmztdgpm0b03Mnrlgq=84648157000133

https://www2.susp.gov.br/aba/municipal/bf0b0e5c5e1e_certidoesusp_2011_1447/fmztdgpm0b03Mnrlgq=84648157000133



2/3

3/3



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° JUV-CP003/2024, cujo objeto compreende a REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula n° 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e n° 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 50.4846244/0001-65.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluiu-se sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou a sua proposta com erro na quantidade do item 1.1 ADM_NR_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA da planilha orçamentária, assim como na sua composição, que não se apresentou em conformidade com o projeto básico. Resultando, inclusive, em um valor total para o item maior do que o orçamento no projeto básico. Portanto, recomendamos a sua desclassificação.





É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 24 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Data: 24/02/2025 09:42:32-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Responsável Técnico do Município de Nova Russas

Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

